

Název akce
Stavební úprava ulice Karla Čapka, Habartov – II. etapa

Změnový list č.1

1. **Objekt a oddíl stavby:** SO 101 - Dopravní řešení
2. **Zpracovatel změnového listu :** *Hoika Jiří – technický dozor stavebníka*
3. **Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno**
 - 3.1 stavební deník: 0
 - 3.2 kontrolní den. KD4 a KD5
 - 3.3 Jiný stanovisko autorizovaného geotechnika
 - 3.4. Projektová dokumentace a položkový rozpočet **položkový rozpočet návrh ZL1a2**

4. Popis předmětu a příčin změny, zdůvodnění a návrh řešení :

4.1 Příčiny změny, zdůvodnění a popis:

SO 101 – Dopravní řešení

Zhotovitel provedl na základě PD odstranění konstrukčních vrstev původních chodníku a odtěžení zeminy na předepsanou úroveň a provedl statické zátěžovací zkoušky dne 17.10.2023. Výsledky těchto zkoušek byly nevyhovující a autorizovaný geotechnik navrhl sanaci pláně. Zhotovitel zpracoval na základě návrhu geotechnika položkové rozpočty na sanaci pláně levostranného a pravostranného chodníku

Cena za oddíl bez DPH

404 548,50.-Kč

Podrobný rozpis prací a dodávek je v příloze č.1 tohoto ZL.

4.2 Návrh řešení

Zhotovitel provedl nacenění víceprací v souladu s SOD a dle doporučení stanoviska geotechnika. Jelikož se jedná o nutnou součást díla, je nezbytné, aby tyto práce a dodávky byly provedeny v rámci díla

5. Podklady k návrhu změny:

- 5.1. Projektová dokumentace 0
- 5.2. Cenová rozpočty ze dne 13.11.2023
- 5.3. Fotodokumentace 0
- 5.4. Celková rekapitulace nákladů schválených ZL článek č. 7
- 5.5. Další podklady zápisy KD4a5
Stanovisko autorizovaného geotechnika

6. Stanovisko zhotovitele stavby:

6.1. Vliv změny na předmět plnění a harmonogram akce : ANO

Předána žádost o prodloužení termínu předání díla do – bude zpracována

Datum :

SILNICE TOPOLANY a.s.

Chomutov

CZ699006672

③

Zástupce zhotovitele
Silnice Topolany a.s.
Hanzi Jakub

7. Rekapitulace nákladů

Popis položek	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)
ÚSPORA v rámci řešené změny	(-)	
NAVÝŠENÍ v rámci řešené změny	(+) 404 548,50.-Kč	489 503,68.-Kč
Celkem v rámci změnového listu navýšení bez DPH	+ 404 548,5.-Kč	489 503,68.-Kč

8. Stanovisko TDS:

9.1. Zvýšené množství realizovaných prací, **má vliv** na konečný termín dokončení akce a **má** dopad na celkové náklady stavby, **navýšení o 404 548,50.-Kč bez DPH.**

9.2. Cenová nabídka zhotovitele **odpovídá skutečnosti** pro provedení na stavbě a ceny **jsou** v souladu s položkovým rozpočtem, který je přílohou smlouvy o dílo na výše uvedenou akci. Zhotovitel předložil naceněný výkaz výměr **víceprací** dle článku 5.15 a násl. smlouvy o dílo na realizaci stavby.

9.3. TDS vzhledem k výše uvedené skutečnosti **doporučuje** objednateli díla tento ZL č.1 odsouhlasit.

9.4. Návrh dalšího postupu administrace odsouhlasování změnového listu dle zákona č.137/2006 Sb.o zadávání veřejných zakázek.

9.5. Uvedené práce souvisí s předmětem díla.

TDS doporučuje objednateli díla tento ZL odsouhlasit.

Datum:

Hoika Jiří
TDS

10. Stanovisko objednatele díla:

Změnový list nabyvá účinnosti podpisem statutárního zástupce Města Habartov formou dodatku ke smlouvě o dílo na dodávku stavby

Datum:

Město Habartov

Změnový list je vyhotoven ve 3 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, jeden výtisk u investora, poslední založen u TDS.

ZL č.1

Sanace pravého chodníku podél školy - NUN

ul. Karla Čapka, Habartov, Karlovarský kraj

Město Habartov

Silnice Topolany a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem bez DPH							197 817,00
0		HSV	Práce a dodávky HSV				197 817,00
0	1		Zemní práce				16 703,60
4	K	122252203	Odkopávky a prokopávky nezapazené pro silnice a dálnice strojné v hornině třídy těžitelnosti I do 100 m3	m3	93,200	127,00	11 836,40
5	K	120001101	Příplatek k cenám vykopavek za zřízení vykopavky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoli třídy	m3	46,600	450,00	20 970,00
10	K	162751117	Vodorovně přemístění vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku bez naložení vykopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	93,200	180,00	16 776,00
11	K	162751119	Vodorovně přemístění vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku bez naložení vykopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 10 000 do 15 000 m. Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	372,800	15,00	5 592,00
12	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložene sypaniny do předepsaného tvaru	m3	93,200	12,00	1 118,40
13	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 04	t	177,080	60,00	10 624,80
21	K	181152302	Uprava plane na stavbách silnic a dálnic strojné v zářezích mimo skalních se zhuštěním	m2	466 000	21,00	9 786 000
0	5		Komunikace				107 150,00
51	K	564861111	Podklad ze sterkoritu SD1 s rozprostřením a zhuštěním plochy přes 100 m2 po zhuštění B 200 mm	m2	466 000	230,00	107 180 000
0	999		Práce a dodávky				10 113,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
163	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva monolitickým betonovým nebo ztvrdným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoli délky objektu	t	214 360	65.00	13 933.40

ZL č.2

Sanace levého chodníku podél školy - NUN

ul. Karla Čapka, Habartov, Karlovarský kraj

Město Habartov

Silnice Topolany a s

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem bez DPH							206 731,50
0		HSV	Práce a dodávky HSV				206 731,50
0	1		Zemní práce				90 160,20
4	K	122252203	Odkopavky a prokopavky nezapážené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I do 100 m3	m3	97 400	127,00	12 369,80
5	K	120001101	Příplatek k cenám vykopavek za zřízení vykopavky v blízkosti podzemního vedení nebo vybušnin v normách jakékoli třídy	m3	49 700	450,00	21 915,00
10	K	162751117	Vodorovně přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku bez naložení výkopku avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 2 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	97 400	180,00	17 532,00
11	K	162751119	Vodorovně přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku bez naložení výkopku avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	389 600	15,00	5 844,00
12	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezisklady bez nutnosti s úpravou uložení sypaniny do předepsaného tvaru	m3	97 400	12,00	1 168,80
13	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skladkovně) zeminy a kameni zaříděného do Kataloгу odpadu pod kódem 17 05 04	t	185 050	60,00	11 103,60
21	K	181152302	Uprava pláče na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezích mimo skalních se zhuštěním	m2	487 000	21,00	10 227,00
0	5		Komunikace				112 010,00
51	K	564861111	Podklad ze sterilodrti SD s rozptřením a zhuštěním plochy přes 100 m2 po zhuštění Ø 200 mm	m2	487 000	230,00	112 010,00
0	900		Étudesní úloha				14 051,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
163	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoli délky objektu	!	224,020	65,00	14 561,30



B-PROJEKTY Teplice s. ZKUSĚBNÍ LABORATOR MECHANIKY ZEMIN

Křídlo: Křídlo 415/01
Adresa: Křídlo 415/01, Nerečický vjezd
415 01 Teplice

EV. číslo vyhodnocení: 537 23 SZZ

Strana: 1/1

Počet vyřádků: 7

Vyřádky:

VYHODNOCENÍ PROVEDENÝCH ZKOUŠEK STANOVENÍ ÚNOSNOSTI A MÍRY ZHUTNĚNÍ ZEMNÍ PLÁŇE A KONSTRUKČNÍ VRSTVY

dle ČSN 72 1006 – kontrola zhutnění zemin a sypanin
příloha A – statická zatěžovací zkouška pro pozemní komunikace

Stavba: Stavební úprava ulice Karla Čapka, Habartov

Objekt: Chodník

Číslo zakázky: 625-TP

Objednavatel: Sílčice Topolany a.s.

Datum zkoušek: 17.10.2023

Požadovaná hodnota modulu přetvárnosti: $E_{def,2} \geq 50$ MPa – konstrukční vrstva

Požadovaná hodnota modulu přetvárnosti: $E_{def,2} \geq 30$ MPa – zemní pláň

Požadovaný poměr modulu přetvárnosti: $E_{def,2} / E_{def,1} \geq 2,5$

Zkouška číslo	Situování zkoušky (staničení)	Modul přetvárnosti [MPa]		Poměr $E_{def,2}/E_{def,1}$	Vyhodnocení
		$E_{def,1}$	$E_{def,2}$		
6030	Konstrukční vrstva km 0,030 – levá strana	10,6	12,4	1,17	Nevyhovuje
6031	Zemní pláň km 0,035 – levá strana	6,1	12,7	2,00	Nevyhovuje

Statická zatěžovací zkouška provedena v úrovni konstrukční vrstvy a zemní pláňe chodníku **neprokázala** v kontrolovaném místě požadovanou hodnotu modulu přetvárnosti $E_{def,2} \geq 50$ resp. 30 MPa. Vzájemný poměr příslušných modulu přetvárnosti $E_{def,2} / E_{def,1}$ byl stanoven v požadovaných mezích. Na základě dosažených výsledků zatěžovací zkoušky geotechnik zhotovitele stavby konstatuje, že **únosnosti konstrukční vrstvy a zemní pláňe chodníku je v kontrolovaném úseku nevyhovující a proto se doporučuje provést odtěžení neúnosných zemin v úrovni aktivní zóny o mocnosti 0,2 m a nahradit vhodným materiálem např. štěrkodrti.**

Vyhodnocení vypracoval:

B-PROJEKTY Teplice s.r.o.

Kontaktní číslo: 415 01 415001


415 01 415001

2

Ing. Jan Veselý

autorizovaný inženýr v oboru zednictví

1. Teplicích dne: 17.10.2023



Protokol o zkoušce


číslo: SZZ 6030/23/1030

Zakázka číslo: 6255-TP
Objednavatel zkoušky: Silnice TOPOLANY a.s., Nerudova 67-10, 430 01 Chomutov
Akce (zkušební místo):** Stavební úprava ulice Karla Čapka, Habartov
Datum zkoušky: 17.10.2023
Číslo zkoušky: 6030
Místo:** Chodník

Zkouška byla provedena in – situ dle normy:
ČSN 72 1006 – Kontrola zhutnění zemin a sypanin – příloha A

Výsledek zkoušky je uveden na straně 2.

Protokol o zkoušce zkontroloval a schválil:


Marek Petraček
vedoucí zkušební laboratoře

Datum vystavení protokolu: 17.10.2023

Výsledek zkoušky včetně přenosu výsledků z tabulek použitých parametrů (č. 1030)
Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře, včetně smí protokoly představením úřadů a zjednatelů.
Hodnoty a výsledky měření jsou k dispozici v úřadní laboratorní pozici, na základě zadání zúčastněných.
Všechna data byla sdělena zákazníkovi a laboratorní zprávy byly vypracovány.

PROTOKOL O STATICKÉ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠCE

Číslo zkoušky: 2022/002/1492
 Stavba a objekt: Stavební úpravy objektu Kursa Čapka, Praha 14

Typ zařízení:	zkušební stůl	Typ:	TS 100
Typ zkoušky:	ČSN EN 12510	Typ zatížení:	Kompresivní
Velikost osy:	200x200	Zkouška:	ČSN EN 12510
Provedení práce:	10	Úroveň:	10000000
		Úroveň:	10000000
		Úroveň:	10000000
		Úroveň:	10000000
		Úroveň:	10000000
		Úroveň:	10000000
		Úroveň:	10000000

Číslo	Průměr	Průměr	Průměr	Průměr	Průměr	Průměr	Průměr
	σ [MPa]	σ [MPa]	σ [MPa]	σ [MPa]	σ [MPa]	σ [MPa]	σ [MPa]
1	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
2	0,048	0,02	0,048	0,02	0,048	0,02	0,048
3	0,100	1,64	0,096	11,41	0,100	1,64	0,096
4	0,199	3,65	0,201	13,23	0,199	3,65	0,201
5	0,301	12,70	0,308	13,04	0,301	12,70	0,308
6	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
7	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
8	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000

Průměr osy:	200	Průměr osy:	200
Průměr osy:	200	Průměr osy:	200
Průměr osy:	200	Průměr osy:	200
Průměr osy:	200	Průměr osy:	200



Protokol o zkoušce

číslo: SZZ 6031/23/1031

Zakázka číslo: 6255 TP
Objednavatel zkoušky: Silnice TOPOLANY a.s., Nerudova 67/10, 430 01 Chomutov
Akce (zkušební místo):** Stavební úprava ulice Karla Čapka, Habartov
Datum zkoušky: 17.10.2023
Číslo zkoušky: 6031
Místo:** Chodník

Zkouška byla provedena in – situ dle normy:
ČSN 72 1006 – Kontrola zhutnění zemín a sypání – příloha A

Výsledek zkoušky je uveden na straně 2

Protokol o zkoušce zkontroloval a schválil:

Marek Peřáček
vedoucí zkušebního laboratoře

Datum vystavení protokolu: 17.10.2023

Výsledek zkoušky v tomto protokolu je znám pouze k předání zemím.
Bez písemného souhlasu zkušebního laboratoře se nemají protokoly přimíslovat ani měnit.
Bodnoty mají platnost pouze do doby, kdy jsou předány zákazníkovi. Zákazník
má právo být seznámen s výsledky zkoušek a případně s nimi souhlasit.

PRŮTOKOL O STATICKE ZATEZOVACÍ ZKOUŠCE

Číslo zkoušky: SZZ 5_3142_1031
 Stavba a objekt: Stavební úprava ulice Karla Čapka, Havantice

Typ zařízení:	BTM Statika s.r.o.	Měřítko:	200:10
Typ zkoušky:	ČSN EN 12510-6	Stavba / díl:	1031 / 1031
Velikost desky:	300 mm	Zkouška:	Průběžná
Převodový poměr:	1:1	Průběh:	Průběžný
		Průběh:	Průběžný
		Průběh:	Průběžný
		Průběh:	Průběžný
		Průběh:	Průběžný
		Průběh:	Průběžný
		Průběh:	Průběžný

Cyklus	Zkouška				Převodový poměr	Převodová síla [kN]	Převodová síla [MPa]	Převodová síla [MPa]
	p [MPa]	střev.	dl. [mm]	šir. [mm]				
0	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	0,080	1,41	0,083	0,08	0,08	0,08	0,08	
2	0,164	4,08	0,164	0,16	0,16	0,16	0,16	
3	0,239	9,09	0,239	0,23	0,23	0,23	0,23	
4	0,316	10,60	0,316	0,31	0,31	0,31	0,31	
5	0,400	12,04	0,400	0,40	0,40	0,40	0,40	
6	0,484	10,69	0,484	0,48	0,48	0,48	0,48	
7	0,500	17,07	0,500	0,50	0,50	0,50	0,50	
8	0,500	17,07	0,500	0,50	0,50	0,50	0,50	
9	0,500	17,07	0,500	0,50	0,50	0,50	0,50	
10	0,500	17,07	0,500	0,50	0,50	0,50	0,50	
11	0,221	11,47	0,221	0,22	0,22	0,22	0,22	
12	0,123	11,43	0,123	0,12	0,12	0,12	0,12	
13	0,000	9,09	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	

Průběžná síla: 0,500 MPa; Průběžná síla: 0,500 MPa; Průběžná síla: 0,500 MPa

Stavebník : Město Habartov, Náměstí Přátelství 112, Habartov, IČ: 00259314

Projekt:

Stavební úprava ulice Karla Čapka, Habartov – II. etapa

Zápis č. 4 Kontrolního dne ze dne 25.10.2023 od 08.00 hod

Místo jednání: Staveniště a přílehlé pozemky Město Habartov – ul Karla Čapka

Přítomní:

Stavebník Město Habartov
v zastoupení
Zhotovitel Silnice Topolany a.s.
v zastoupení

Kucharova P.
Hanzl J., Matoušek L.

Ostatní
TDS

Holka J.

Termíny dokončení stavebních prací dle vydaných pravomocných stavebních povolení:

Stavební povolení č.j. MUSO/11404/2023-OSUP/KAZI ze dne 31.01.2023 s termínem dokončení díla 31.12.2024

Bod č. **Kontrola postupu prací dle Harmonogramu plnění díla**

Termíny harmonogramu plnění díla v měsících 2023
Silnice Topolany a. s. | Nerudova 67/10 | 430 01 Chomutov |



ORIENTAČNÍ ČASOVÝ HARMONOGRAM PRACÍ: dokončení 20.1.2024

SO 101 Komunikace

Upravení st. ÚPZ
Zemní a hromadné práce
Kanalizační díla
Sedlová a aktivní zóny
Kontrolníkem vzhledy
Pokládka obrub
Pokládka dlažby
Pokládka železobetonových krytél
VPS - KDS
Vyklopení staveniště

SO 401 Verejné osvětlení

Uzemní práce
Instalace kabelů
Příčky pro sloupky
Návrh sloupů a svítidel

1.	Postup prací zhotovitele není k dnešnímu dni v souladu s aktualizovaným realizačním harmonogramem plnění díla ze dne 19.10.2023 .
3	Termín podpisu SOD 08.08.2023
4	Datum předání staveníště 20.09.2023
5	Datum zahájení prací 02.10.2023
6	Termín dokončení díla dle SOD 15.01.2023

Bod č.	Kontrola Finančního plnění	
1	Smluvní cena: Cena díla dle SOD (bez DPH)	9.487.944,65.-Kč
2	Finanční plnění za měsíc: Celkem měsíční soupis provedených prací zhotovitele za období: (bez DPH)	0,00.-Kč
3	Plnění od počátku zahájení stavby vč. posledního soupisu provedených prací: Kumulovaný soupis provedených prací zhotovitele do: (bez DPH)	0,00.-Kč
4	Odsouhlasený Změnový list č. 1 ze dne (bez DPH)	0,00.-Kč
5	Zbývající fakturace do termínu dokončení: Kumulovaný zbytek fakturace zhotovitele (bez DPH):	9.487.944,65.- Kč

Bod č.	Obecné požadavky projektu	Odpovídá	Termín
1	Zhotovitel předloží seznam pracovníků na stavbě – seznam bude aktualizován ke každému 1. dni měsíce formou přílohy stavebního deníku	Zhotovitel	průběžně
2	TDS požaduje od zhotovitele vždy k cca 25. dni měsíce předložení soupisu provedených prací v daném fakturačním období v elektronické podobě a doloží v listěné formě.	Zhotovitel	průběžně
3	TDS od 25. do 30. dne v daném fakturačním období provede kontrolu správnosti soupisu provedených prací zhotovitele	TDS	průběžně
4	TDS požaduje v průběhu výstavby na zhotoviteli důsledné dodržování zásad BOZP na stavbě - například: nošení přileb, výstražné vesty, kontrola stavu výkopu, zajištění výkopu proti vstupu nepovolených osob, zajištění nepoužívané odstavené mechanizace, zajištění staveniště proti vstupu nepovolených osob, ohrazování výkopu proti vstupu nepovolených osob, apod.	Zhotovitel	průběžně
5	Zhotovitel bude provádět průběžně úklid staveniště a čištění komunikace	Zhotovitel	Průběžně

Předané dokumenty	Předávající	Termín

Postup prací
KD4 - odkopávky na pláň chodníku - příprava lože pro osazování obrub silničních - oplocení staveniště

Nové úkoly a záznamy z KD	Odpovídá	Termín
KD1 – Zhotovitel přednostně uzpůsobí nivelyty komunikací stavajícím vstupům: schodům a vjezdům na pozemky	Zhotovitel TDS	INFO
KD1 – Stavebník prověří možnost demontáže nestabilní opěrné stěny u č.p. 118 a následnou úpravu přilehlého chodníku KD2 – Opěrná stěna odstraněna, stavebník rozhodl o nahradě opěrné stěny za betonový silniční obrubník 8*25*100.	Stavebník	INFO
KD2 – Zhotovitel zajistí provedení SZZ v tělese chodníku na každé straně 1x pláň a 1x konstrukční vrstva KD3 – SZZ provedeny dne 17.10.2023 s výsledky: Pravá strana šterkodní Edef ₂ 20, poměr Edef ₂ /Edef ₁ : 2,04 – nevyhovující Levá strana pláň Edef ₂ 12, poměr Edef ₂ /Edef ₁ : 2,0 – nevyhovující Levá strana šterkodní Edef ₂ 12, poměr Edef ₂ /Edef ₁ : 1,17 – nevyhovující Stavebník spolu s TDS vyhodnotily výsledky zkoušek jako nevyhovující. Zhotovitel s přízvaným geotechnikem navrhnu způsob sanace tělesa chodníku vč. návrhu ZL. KD4 – Zhotovitel předal návrh ZL č. 1-sanace neunosné pláne pravostranného chodníku, nutno dopožít stanoviskem geotechnika	Zhotovitel TDS	01.11.2023
KD3 – Stavebník souhlasí se směrovou úpravou parkoviště K&G	Stavebník	INFO
KD4 – Zhotovitel provede sondy a odkopání inženýrských sítí v levostranném chodníku a přizve provozovatele sítí ke kontrole	Zhotovitel TDS	INFO

Stavební úprava ulice Karla Čapka, Habartov – II. etapa
Tento zázpis je nedílnou součástí stavebního deníku stavby.

Zázpis rozšířen elektronicky účastníkem: e-mail

1. podpis stavebníka:
2. podpis zhotovitele:

Změny projektu


KD2

- osazení betonové obruby 8*25*100 za náhradu opěrné stěny

Pozvánka na první kontrolní den realizace stavby 01.11.2023 od 08:00hod se srazem v místě stavby

Přečteno, odsouhlaseno a podepsáno všemi přítomnými: - viz. příložená prezenční listina

Tento zápis je záznamem z jednání a má se za to, že je akceptován, pokud není připomínkovan do dvou dnů od jeho distribuce. Tento zápis je nedílnou součástí stavebního deníku.
Případné připomínky zasílejte na j.horka@seznam.cz

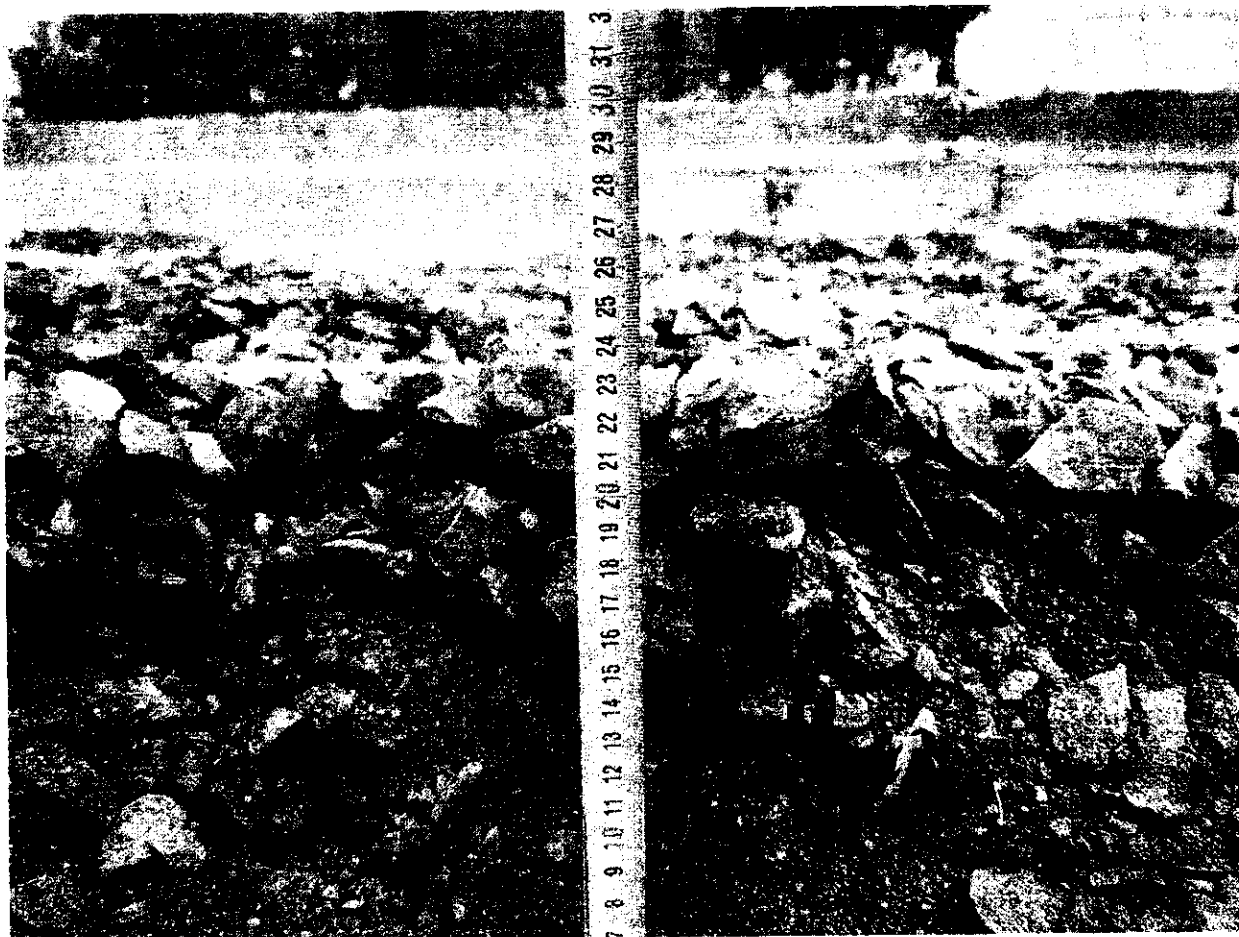

Stavební úprava ulice Karla Čapka, Habartov – II. etapa
Tento zápis je nedílnou součástí stavebního deníku stavby

Zápis rozeslán elektronicky účastníkům jednání
mj.horka@seznam.cz, j.horka@seznam.cz



Stavební úprava ulice Karla Čapka, Habartov – II. Útapa
Tento zápis je nedílnou součástí stavebního deníku stavby.

Stavebník : Město Habartov, Náměstí Přátelství 112, Habartov, IČ : 00259314

Projekt:

Stavební úprava ulice Karla Čapka, Habartov – II. etapa

Zápis č. **5** Kontrolního dne ze dne 01.11.2023 od 13.00 hod

Místo jednání:

Staveniště a přílehlé pozemky Město Habartov – ul. Karla Čapka

Přítomní:

Stavebník Město Habartov
v zastoupení
Zhotovitel Silnice Topolany a. s.
v zastoupení

Kuchařova P.
Hanzl J., Matoušek L.

Ostatní:

TDS

Hořka J.

Termíny dokončení stavebních prací dle vydaných pravomocných stavebních povolení:


Stavební povolení č.j. MUSO/11404/2023/OSUP/KAZI ze dne 31.01.2023 s termínem dokončení díla 31.12.2024.

Bod č. **Kontrola postupu prací dle Harmonogramu plnění díla**

Termíny harmonogramu plnění díla v měsících 2023

Silnice Topolany a. s. | Nerudova 67/10 | 430 01 Chomutov I

ORIENTAČNÍ ČASOVÝ HARMONOGRAM PRACÍ: dokončení 20.1.2024

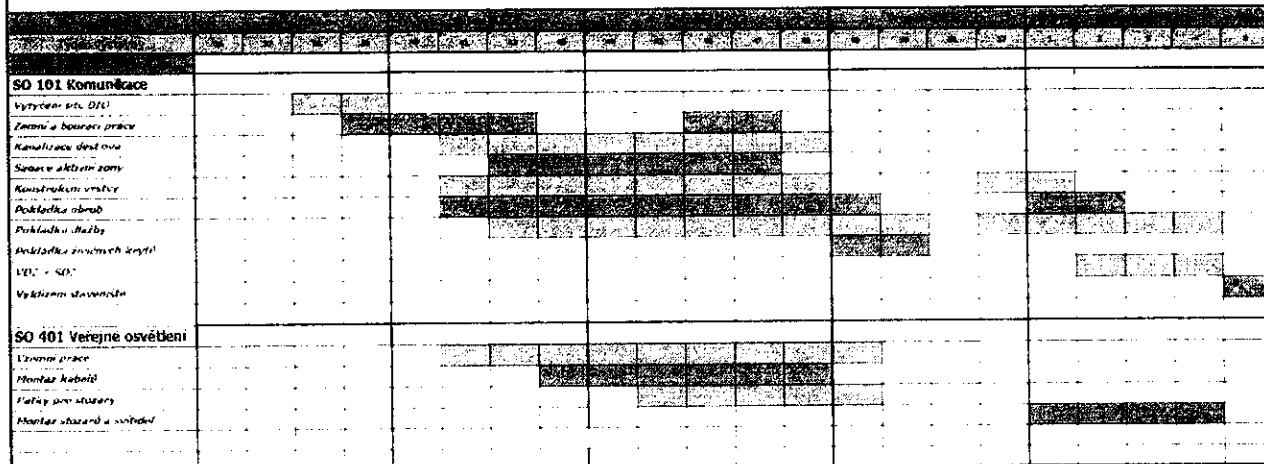

2 Postup prací zhotovitele **není** k dnešnímu dni v souladu s aktualizovaným reálným harmonogramem plnění díla ze dne **19.10.2023**.

3 Termín podpisu SOD **08.08.2023**

4 Datum předání staveniště **20.09.2023**

5 Datum zahájení prací **02.10.2023**

6 Termín dokončení díla dle SOD **15.01.2023**

Bod č.	Kontrola Finančního plnění	
1	Smluvní cena: Cena díla dle SOD (bez DPH)	9.487.944,65.-Kč
2	Finanční plnění za měsíc: Celkem měsíční soupis provedených prací zhotovitele za období říjen 2023 (bez DPH)	465 622,90.-Kč
3	Plnění od počátku zahájení stavby vč. posledního soupisu provedených prací: Kumulovaný soupis provedených prací zhotovitele do říjen 2023 (bez DPH)	465 622,90.-Kč
4	Odsouhlasený Změnový list č. 1 ze dne (bez DPH)	0,00.-Kč
5	Zbývající fakturace do termínu dokončení: Kumulovaný zbytek fakturace zhotovitele (bez DPH)	9 022 327,19.- Kč

Bod č.	Obecné požadavky projektu	Odpovídá	Termín
1.	Zhotovitel předloží seznam pracovníků na stavbě – seznam bude aktualizován ke každému 1. dni měsíce formou přílohy stavebního deníku	Zhotovitel	pruběžně
2	TDS požaduje od zhotovitele vždy k cca 25. dni měsíce předložení soupisu provedených prací v daném fakturačním období v elektronické podobě a doloží v tištěné formě.	Zhotovitel	pruběžně
3	TDS od 25. do 30. dne v daném fakturačním období provede kontrolu správnosti soupisu provedených prací zhotovitele.	TDS	pruběžně
4.	TDS požaduje v průběhu výstavby na zhotoviteli důsledně dodržování zásad BOZP na stavbě - např. nošení přileb, výstražné vesty, kontrolu stavu výkopu, zajištění výkopu proti vstupu nepovolených osob, zajištění nepoužívané odstavené mechanizace, zajištění staveniště proti vstupu nepovolených osob, ohrazování výkopu proti vstupu nepovolených osob, apod.	Zhotovitel	pruběžně
5.	Zhotovitel bude provádět průběžně úklid staveniště a čištění komunikace	Zhotovitel	Pruběžně

Předané dokumenty	Předávající	Termín

Postup prací
<p>KD4</p> <ul style="list-style-type: none"> - odkopávky na plaň chodníku - příprava lože pro osazování obrub silničních - oplocení staveniště <p>KD5</p> <ul style="list-style-type: none"> - sondy podzemního vedení - osazování obrub silničních do lože betonového - odkopávky pro K&G

Nové úkoly a záznamy z KD	Odpovídá	Termín
KD1 – Zhotovitel přednostně uzpůsobí nivelitu komunikací stavajícím vstupům, schodům a vjezdům na pozemky	Zhotovitel TDS	INFO
KD1 – Stavebník prověří možnost demontáže nestabilní opěrné stěny u č.p. 118 a následnou úpravu přilehlého chodníku. KD2 – Opěrná stěna odstraněna, stavebník rozhodl o nahradě opěrné stěny za betonový silniční obrubník 8*25*100.	Stavebník	INFO
KD2 – Zhotovitel zajistí provedení SZZ v tělese chodníku na každé straně 1x plaň a 1x konstrukční vrstva KD3 – SZZ provedeny dne 17.10.2023 s výsledky Prava strana šterkodrt Edef ₂ 20, poměr Edef ₂ /Edef ₁ = 2,04 - nevyhovující Leva strana plaň Edef ₂ 12, poměr Edef ₂ /Edef ₁ = 2,0 - nevyhovující Levá strana šterkodrt Edef ₂ 12, poměr Edef ₂ /Edef ₁ = 1,17 - nevyhovující Stavebník spolu s TDS vyhodnotí výsledky zkoušek, jako nevyhovující. Zhotovitel s prizvaným geotechnikem navrhne způsob sanace tělesa chodníku vč. návrhu ZL. KD4 – Zhotovitel předá návrh ZL č.1-sanace neúnosné planě pravostranného chodníku, nutno doložit stanoviskem geotechnika KD5 – Stanovisko geotechnika doloženo. Zhotovitel v součinnosti s geotechnikem navrhne sanaci neúnosné planě levostranného chodníku a zpracuje návrh ZL2	Zhotovitel TDS	08.11.2023

Stavební úprava ulice Karla Čapka, Habartov – H. Útapa
Tento zápis je neoficiální součástí stavebního deníku stavby.

Zápis rozšířen elektronicky (digitálním podpisem)
Kontaktní osoba: Ing. Jiří Čížek

KD4 -- Zhotovitel provede sondy a odkopani inženýrských sítí v levostranném chodníku a přízve provozovatele sítí ke kontrole. KD5 -- Sondy provedeny, vedení identifikováno jako staré nefunkční vedení VO. Zhotovitel provede jeho odstranění z aktivní zóny konstrukce.	Zhotovitel TDS	INFO
--	-------------------	------

Změny projektu

KD2

- osazení betonové obruby 8*25*100 za nahradu opěrné stěny

Pozvánka na příští kontrolní den realizace stavby: 08.11.2023 od 08:00hod. se srazem v místě stavby

Přečteno, odsouhlaseno a podepsáno všemi přítomnými: - viz. příložená prezenční listina


Tento zápis je zaznamem z jednání a má se za to, že je akceptován, pokud není připomínkovan do dvou dnů od jeho distribuce. Tento zápis je nedílnou součástí stavebního deníku. Případné připomínky zasílejte na j.horkad@seznam.cz



Stavební úprava ulice Karla Čapka, Habartov -- II. etapa
 Tento zápis je nedílnou součástí stavebního deníku stavby.

Zápis rozeslán e-mailovou cestou všem účastníkům jednání

horkad@seznam.cz | 731 525 222 | www.horkad.cz | www.horkad.cz | www.horkad.cz | www.horkad.cz | www.horkad.cz

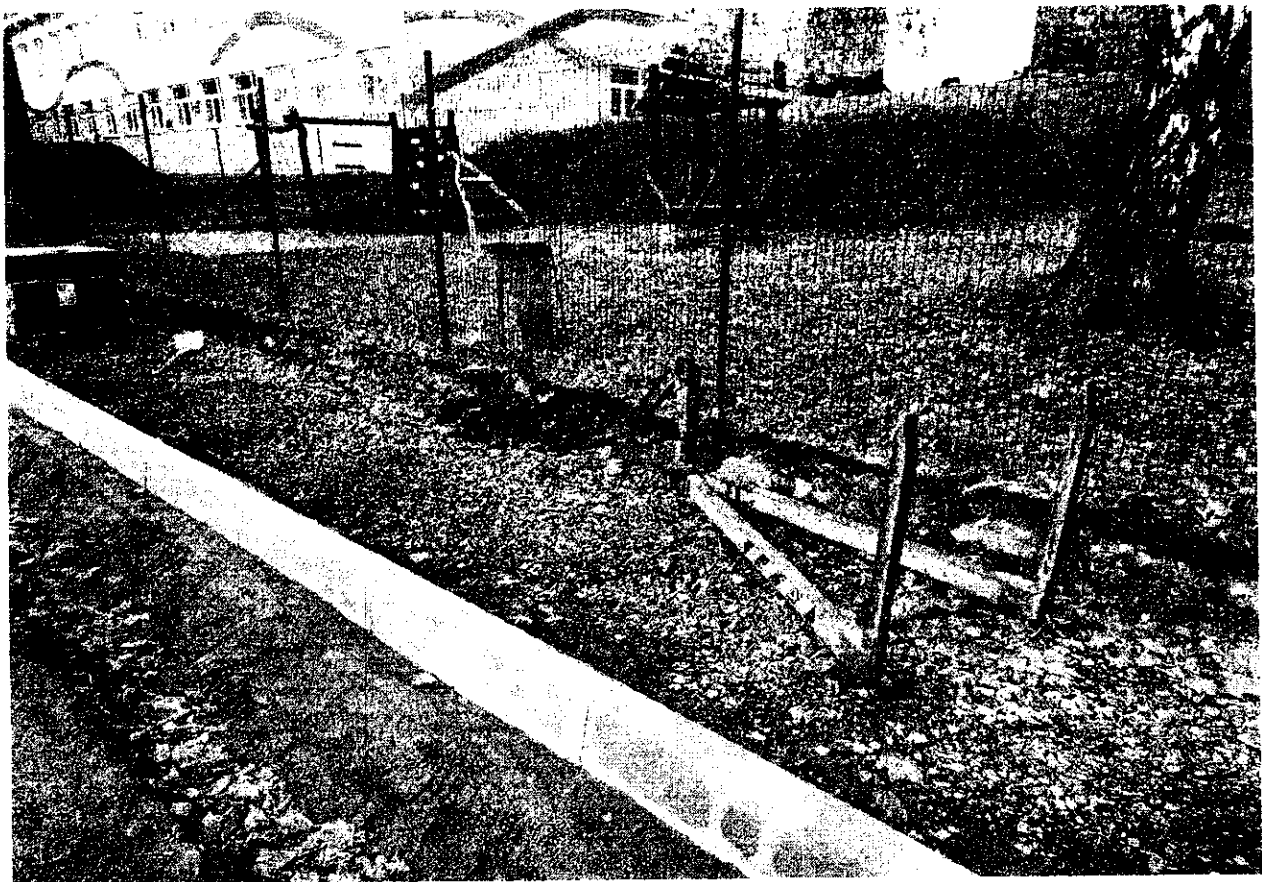

Stavební úprava ulice Karla Čapka, Habartov – II. etapa
Tento zápis je nedílnou součástí stavebního deníku stavby.



Stavební úprava ulice Karla Čapka, Habartov – II. etapa
Tento zápis je nedílnou součástí stavebního deníku stavby.

Zápis rozeslán elektronicky účastníkům jednání.

Pro účely místního územního úřadu a příslušných orgánů státní správy a územní správy.
