

DODATEK č. 4

ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby „Úprava ploch Hornického náměstí, jako východiska Stříbrné stezky“ ze dne 28. 2. 2012

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito účastníky:

Město Jáchymov; IČ 00254622
se sídlem nám. Republiky 1, 362 51 Jáchymov
jednající starostou p. Ing. Bronislavem Grulichem

jako objednatel

a

EUROVIA CS, a.s.; IČ: 45274924
se sídlem Národní 10, 11319 Praha 1; Kontaktní adresa: EUROVIA CS,
a.s. odštěpný závod oblast Čechy západ, závod Karlovy Vary
jednající Ing. Antonínem Rybáčkem, CSc., ředitelem závodu Karlovy Vary

jako zhotovitel

ČÁST PRVNÍ

1. Smluvní strany se ve smyslu článku IV. odst. 4.5. smlouvy dohodly, že zhotovitel pro objednatele provede další práce uvedené ve změnovém listu č. 8, bod 3., který je součástí tohoto dodatku a který obsahuje přesnou specifikaci prací, materiálů a cen za provedení těchto prací. Tyto vícepráce jsou součástí předmětu díla podle čl. I smlouvy a platí pro ně všechna ujednání smlouvy.
2. Cena prací podle změnového listu č. 8, bod 3. je v celkové výši Kč 5.835,- bez DPH (Kč 7.002,- s 20 % DPH); tato částka představuje zvýšení ceny díla.
3. Podle změnového listu č. 8, bod 1. – zrušení dodávky plakátovacích ploch -, neprovedení těchto prací představuje snížení hodnoty ve výši Kč 55.465,- bez DPH (Kč 66.558,- s 20 % DPH), podle změnového listu č. 8, bod 2. – zrušení úpravy místa pro přecházení na p.p.č. 4882/4 -, neprovedení těchto prací představuje snížení hodnoty ve výši 11.751,- bez DPH (Kč 14.101,- s 20% DPH); tyto částky představují snížení ceny díla.

ČÁST DRUHÁ

1. Na základě skutečností uvedených v části první se Smlouva o dílo ze dne 28. 2. 2012, a to článek IV odst. 1 mění takto:

4.1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou a činí:

Cena bez DPH KČ 6 240 375,-

DPH KČ 1 248 075,-

Cena celkem včetně DPH KČ 7 488 450,-

Položkový rozpočet stavby je přílohou č. 5, k níž náleží i změnový list č. 8.

ČÁST TŘETÍ

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nedotčena.

Tento dodatek se vyhotovuje dvojmo a nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu.

V Jáchymově dne 30.11.2012

V Karlových Varech, dne 30.11.2012

.....
za objednatele:



.....
za dodavatele:



Doložka podle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: Tento dodatek byl schválena usnesením Rady města Jáchymov ze dne 4.12. 2012 č. 1.2.



ÚPRAVA PLOCH HORNICKÉHO NÁMĚSTÍ, JAKO VÝCHODISKA STŘÍBRNÉ STEZKY

ZMĚNOVÝ LIST Č.: 8

Specifikace prací:

- 1/ ZRUŠENÍ DODÁVKY PLAKÁTOVACÍCH PLOCH**
- 2/ ZRUŠENÍ MÍSTA ÚPRAVY MÍSTA PRO PŘECHÁZENÍ NA P.P.Č. 4882/4**
- 3/ DODÁVKA ODVODŇOVACÍHO ŽLABU Z POLYMERBETONU**

Název stavby:

Úprava ploch Hornického náměstí, jako východiska Stříbrné stezky

Název projektu: Stříbrná stezka - Silberstrasse - 1. investiční etapa

Registrační číslo: 100066838

Smlouva o dílo č.:

Objednatele **1/12** ze dne **28.2.2012**

Zhotovitele ---

Objednatel:

Město Jáchymov, nám. Republiky 1, 362 51 Jáchymov

IČ 00254622

Zhotovitel:

EUROVIA CS, a.s.; Se sídlem: Národní 10, 11319 Praha 1; Kontaktní adresa: EUROVIA CS, a.s. odštěpný závod oblast Čechy západ, závod Karlovy Vary

IČ: 45274924

Technický dozor
objednatele:

Ing. Roman Havlan, Dolní Žďár 31, 363 01 Ostrov

IČ: 72256583

Řešeno v rámci KD:

**KD 16 ze dne
20.11.2012**

Číslo strany ve stavebním deníku, kde je
změna zanesena:

**List č. 5/strana 1 – viz.
zápis z Kontrolního dne č.
zápisu KD 16/1,2,3**

Specifikace a odůvodnění
změny:

1/ Zrušení dodávky Plakátovacích ploch

V souvislosti s realizací souběžně probíhající realizace dodávky plakátovacích ploch v rámci jiného projektu, nebudou na základě požadavku objednatele dodány plakátovací plochy předpokládané projektem Úpravy ploch Hornického náměstí, jako východiska Stříbrné stezky.

2/ Zrušení úpravy místa pro přecházení na p.p.č. 4882/4

Projektová dokumentace předpokládala úpravu místa pro přecházení na p.p.č. 4882/4.

Protože v místě navrhované úpravy je rovná asfaltová plocha navazující na stávající komunikaci bylo projektantem rozhodnuto nerealizovat navrhované úpravy, s tím že stávající stav je s ohledem na platnou legislativu vyhovující.

Rozsah neprovedeného plnění:

- odstranění stávajícího asfaltového krytu vč. Konstrukčních vrstev o výměře 10,75m²
- dodávka a montáž 5m žulového obrubníku, 1,2m² barevné reliéfní dlažby a 8,8m² mozaiky

3/ Dodávka odvodňovacího žlabu z polymerbetonu

Po provedení odkopů pro novou zpevněnou plochu z mozaiky před Radnicí bylo zjištěno, že svod ve střední části stěny je sveden do podmoku. S ohledem na zjištěný stav bylo rozhodnuto, že bude doplněn odvodňovací žlab pro svedení dešťových vod do nově navrženého žlabu vedeného podél objektu. Příčné uložení žlabu bude dále odvádět povrchovou vodu natékající v podélném směru nově budovaných zpevněných ploch

Datum vzniku změny:

20.11.2012




ÚPRAVA PLOCH HORNICKÉHO NÁMĚSTÍ, JAKO VÝCHODISKA STŘÍBRNÉ STEZKY

ZMĚNOVÝ LIST Č.: 8

Specifikace prací:

- 1/ ZRUŠENÍ DODÁVKY PLAKÁTOVACÍCH PLOCH
- 2/ ZRUŠENÍ MÍSTA ÚPRAVY MÍSTA PRO PŘECHÁZENÍ NA P.P.Č. 4882/4
- 3/ DODÁVKA ODVODŇOVACÍHO ŽLABU Z POLYMERBETONU

Situace:

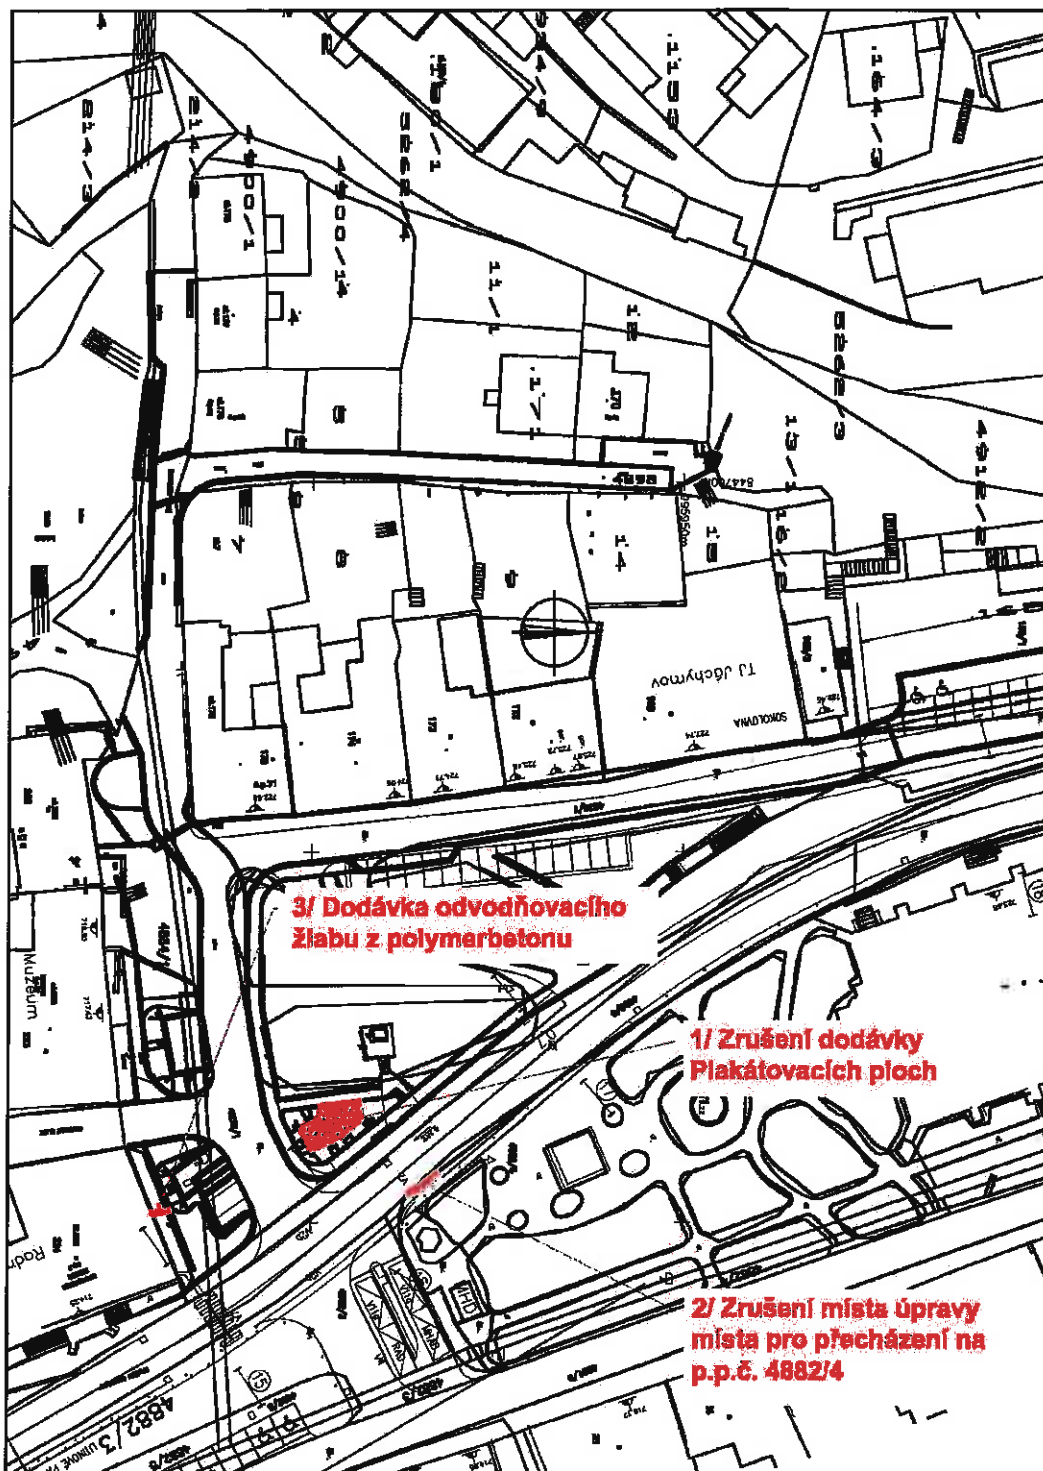



Europäische Union. Europäischer Fonds für
regionale Entwicklung: Investition in Ihre
Zukunft / Evropská unie. Evropský fond pro
regionální rozvoj: Investice do vaší budoucnosti



Ziel 3 | Cíl 3

Ahoj sousede. Hallo Nachbar.
2007-2013. www.ziel3-cil3.eu

ÚPRAVA PLOCH HORNICKÉHO NÁMĚSTÍ, JAKO VÝCHODISKA STŘÍBRNÉ STEZKY

ZMĚNOVÝ LIST Č.: 8

<u>Specifikace prací:</u>	1/ ZRUŠENÍ DODÁVKY PLAKÁTOVACÍCH PLOCH 2/ ZRUŠENÍ MÍSTA ÚPRAVY MÍSTA PRO PŘECHÁZENÍ NA P.P.Č. 4882/4 3/ DODÁVKA ODVODŇOVACÍHO ŽLABU Z POLYMERBETONU
---------------------------	--

Rekapitulace:

1/ ZRUŠENÍ DODÁVKY PLAKÁTOVACÍCH PLOCH	-55 465 Kč
2/ ZRUŠENÍ MÍSTA ÚPRAVY MÍSTA PRO PŘECHÁZENÍ NA P.P.Č. 4882/4	-11 751 Kč
3/ DODÁVKA ODVODŇOVACÍHO ŽLABU Z POLYMERBETONU	5 835 Kč
Celkem	-61 381 Kč
DPH 20% :	-12 276 Kč
Celková cena vč. 20%DPH :	-73 657 Kč

Objednatel:

Ing. Bronislav Grulich

starosta

Jan Hadrava

vedoucí Odboru
hospodářsko-správního

Ing. Roman Havlan

technický dozor objednatele

Zhotovitel:

Ing. Antonín Rybáček, CSc.

Ředitel závodu Karlovy Vary
na základě plné moci
EUROVIA CS, a.s.

Projektant:

Ing. Anton Jurica

projektant - Jurica a.s.,
362 62 Boží Dar 176



Ing. Roman HAVLAN
 Projektová a inženýrská činnost ve výstavbě
 Dolní Ždár 31, 363 01 Ostrov
 Tel.: 353 615 982 IČ: 722 56 583



EUROVIA CS, a.s.
odštěpný závod oblast Čechy západ
závod Karlovy Vary
Sedlečská 72, 360 02 Karlovy Vary


JURICA a.s.
 ① ARCHITEKTURA • PROJEKTY • STAVBY
 362 62 Boží Dar 176 353 844 402
 363 01 Ostrov, Staré náměstí 53 353 176 631
 363 01 Sokolov, Křížová 121 352 624 083
 IČ: 226384795 - www.jurica.cz

Přílohy:

1) Položkový rozpočet

ROZPOČET - příloha Změnového listu č. 8

Stavba: Sítňová stezka - Silberstrasse - 1.investiční etapa

Objekt: KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY + MOBILIÁŘ

Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
1/ ZRUŠENÍ DODÁVKY PLAKÁTOVACÍCH PLOCH					
131203101	Hloubení jam ručním nebo pneu. nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	-0,380	737,00	-280
131203109	Příplatek za lepkovost u hloubení jam ručním nebo pneu. nářadím v hornině tř. 3	m3	-0,380	48,51	-18
272313511	Základové patky z betonu tř. C 12/15	m3	-0,400	2 034,27	-814
936174311	Montáž plakátovací plochy	kus	-2,000	2 946,00	-5 892
749101950	plakátovací plocha jednostranná 2500x1500 z plechu	kus	-2,000	21 954,00	-43 908
900900001	Kotevní materiál	kpl	0,000	3 054,50	0
999999001	Doprava	kpl	-1,000	4 175,07	-4 175
998231311	Přesun hmot. pro sadovnické a krajinařské úpravy vodorovně do 5000 m	t	-1,197	315,50	-378
mezisoučet					-55 465

2/ ZRUŠENÍ MÍSTA ÚPRAVY MÍSTA PRO PŘECHÁZENÍ NA P.P.Č. 4882/4

113107142	Odstanění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm	m2	-10,750	59,94	-644
113107112	Odstanění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těžšího tl 200 mm	m2	-10,750	30,21	-325
916241113	Osazení silničního obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-5,000	301,75	-1 509
583803330	obrubník kamenný přímý, žula, OP3 25x20	m	-5,000	910,00	-4 550
596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	-1,200	208,70	-250
592451190	dlažba zámková slepecká 20x10x6 cm barevná	m2	-1,200	155,00	-186
591411111	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z kameniva	m2	-8,800	198,95	-1 751
583800100	mozaika dlažební, žula 4/6 cm	t	-1,000	2 536,00	-2 536
mezisoučet					-11 751

3/ DODÁVKA ODVODŇOVACÍHO ŽLABU Z POLYMERBETONU

935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	2,500	328,00	820
592270020	žlab odvodňovací polymerbeton 100 x 13 x 16,5 x 17 cm	kus	2,500	906,00	2 265
592270220	rošt mřížkový - grafitová tvárná litina 50cm x 12,7cm x 493cm2/m, tř.zatíž. C250	kus	5,000	550,00	2 750
mezisoučet					5 835
Celkem					-61 381
