

SMLOUVA O DÍLO

Vybudování technické a dopravní infrastruktury – zhotovení PD a výkon činnosti AD

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

mezi:

Název: Sdružení zadavatelů (společné zadávání podle § 7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“))

Název: Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.
Sídlo: Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov
IČO: 26348349
DIČ: CZ26348349
Právní forma: 121 - akciová společnost
Zastoupení: [redacted], předseda představenstva
[redacted], člen představenstva
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]

Název: Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Sídlo: Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
Právní forma: 301 – státní podnik
Zastoupení: [redacted], generální ředitel
[redacted] ředitel Správy Karlovy Vary
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]

Oprávněný zástupce
ve věcech obchodních
a smluvních dodatků: [redacted]
Oprávněný zástupce
ve věcech
technických:
(dále jen „objednatel“)

a

Název: SUDOP PRAHA a.s.
Sídlo: Olšanská 2643/1a, Žižkov, 130 00 Praha 3
IČO: 25793349
DIČ: CZ25793349
Právní forma: Akciová společnost
Zápis ve veřejném rejstříku: OR vedený Městským soudem v Praze, sp. zn. 6088

Zastoupení: [REDACTED], předseda představenstva
[REDACTED], místopředseda představenstva
[REDACTED], místopředseda představenstva

Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků: [REDACTED]
Oprávněný zástupce ve věcech technických: [REDACTED]
(dále jen „zhotovitel“)

1. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ

- 1.1. Objednatel je zadavatel zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem Vybudování technické a dopravní infrastruktury – zhotovení PD a výkon činnosti AD (dále jen „**zadávací řízení**“) po uzavření této smlouvy o dílo (dále jen „**smlouva**“).
- 1.2. Zhotovitelem je dodavatel, který podal nabídku v rámci zadávacího řízení a se kterým byla na základě výsledku zadávacího řízení uzavřena smlouva.
- 1.3. Podzhotovitelem je i poddodavatel uvedený v nabídce podané zhotovitelem v rámci zadávacího řízení po uzavření smlouvy.
- 1.4. Objednatel je žadatelem o poskytnutí dotace v rámci Operačního programu Spravedlivá transformace, název projektu: Sokolovská investiční a green development, registrační číslo: CZ.10.01.01/00/22_001/0000234 (dále jen „**projekt**“).

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést dílo, které je blíže specifikováno ve smlouvě, a závazek objednatel dílo převzít a zaplatit cenu díla.
- 2.2. Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatel dílo v rozsahu, způsobem a v jakosti podle smlouvy, na svůj náklad a nebezpečí, řádně a včas.
- 2.3. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla a příslušnou DPH, je-li zhotovitel povinen podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZoDPH**“), hradit DPH.

3. PŘEDMĚT DÍLA

- 3.1. Předmětem díla je vypracování jednotlivých stupňů projektové dokumentace pro výstavbu Infrastruktury (tj. základní technickou a dopravní infrastrukturu, která bude sloužit při vybudování stavebních záměrů, tj. SSÚD (Středisko správy a údržby dálnice) a Průmyslové zóny Staré Sedlo (Strategická průmyslová zóna Staré Sedlo), dále také „**Infrastruktura**“) a dále výkon autorského dozoru.
- 3.2. Zhotovitel prohlašuje, že dílo budou provádět autorizované osoby s příslušným oprávněním potřebným k provedení projekčních prací, které jsou předmětem této smlouvy, a že disponuje zkušenostmi a technickými prostředky nezbytnými k vyhotovení předmětu plnění podle této smlouvy, v rozsahu, kvalitě a termínu touto smlouvou dohodnutých.
- 3.3. Nedílnou součástí provedení díla a ceny díla je:
 - a) zpracování projektové dokumentace pro povolení záměru Infrastruktury (dále jen „DPZ“, příp. „PDPZ“), podle zákona č. 283/2021 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a právních předpisů provádějící stavební zákon, zejména vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 227/2024 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace staveb dopravní infrastruktury, včetně zpracování či zajištění veškerých potřebných podkladů, průzkumů a zaměření v rámci

předprojektové přípravy. Součástí DPZ bude stanovení předpokládaných nákladů stavby pomocí cenových ukazatelů s přihlédnutím k dalším podmínkám projektované stavby (požadovaná kvalita, požadovaný standard vybavení, místo realizace, situace na trhu aj.),

- včetně zajištění komplexní inženýrské činnosti související s vyřízením potřebných povolení, zejména pro vydání povolení záměru, včetně zajištění samotného podání žádosti o vydání povolení záměru a zajištění pravomocného povolení záměru;
- b) zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby Infrastruktury, která bude zároveň podkladem pro výběr dodavatele stavebních prací, (dále jen „DPS“, příp. „PDPS“) a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr podle stavebního zákona, vyhlášky o dokumentaci staveb a vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „vyhláška o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce“);
- c) poskytnutí součinnosti při výběru dodavatele veřejné zakázky na stavební práce (dále jen „Zhotovitel stavby“), zejména součinnosti v rámci přípravy zadávací dokumentace a průběhu zadávacího řízení (poskytnutí vysvětlení nebo doplnění zadávací dokumentace, provedení změn v zadávací dokumentaci, součinnost při posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím řízení apod.);
- d) v provádění autorského dozoru v průběhu provádění díla (realizace stavby Infrastruktury) ve vztahu k projektové dokumentaci pro provádění stavby zahrnující následující činnosti:
- kontrolu dodržování souladu prováděné Stavby s ověřenou projektovou dokumentací včetně dodržování podmínek určených povolením,
 - poskytování vysvětlení potřebných pro plynulou výstavbu,
 - kontrolu provádění stavby z hlediska technického a technologického,
 - poskytování vysvětlení a rad při vypracovávání dílenské a výrobní dokumentace Zhotovitelem stavby a kontrola souladu dílenské a výrobní dokumentace se zadáním dle dokumentace pro provádění stavby,
 - poradenství při provádění detailů a složitějších atypických konstrukcí,
 - poskytování potřebných konzultací, písemných vysvětlení a jiné potřebné součinnosti při plnění příslušné veřejné zakázky na základě těchto dokumentů,
 - vyjadřování se ke změnám projektové dokumentace pro provádění stavby vyvolaným průběhem stavebních prací nebo ke změnám projektové dokumentace pro provádění stavby navržených Zhotovitelem stavby či Objednatelem, příp. jím pověřenou osobou zajišťující technický dozor investora,
 - posuzování návrhů Zhotovitele stavby na změny a odchylky v částech projektové dokumentace pro provádění stavby zpracovávaných Zhotovitelem

z pohledu dodržení technickoekonomických parametrů stavby, případně dalších údajů a ukazatelů,

- odsouhlasení použitých materiálů a výrobků na základě vzorků,
 - poskytování písemných stanovisek k požadavkům na změny Stavby, popř. změny materiálů, to vše z vlastní iniciativy nebo kdykoliv na vyžádání Objednatele,
 - vyjádření k požadavkům na vícepráce a méněpráce oproti projektové dokumentaci pro provádění stavby,
 - operativní zpracování návrhů přijatých drobných úprav a drobných změn dokumentace souborného řešení projektu a projednávání postupů a podmínek prací na změnách většího rozsahu, včetně účasti na souvisejících změnových řízeních,
 - navrhování a projednávání změn a odchylek od vlastního řešení projektu, která mohou přispět ke zvýšení efektivity dříve přijatého řešení nebo ke snížení či odstranění definovaných rizik projektu, včetně účasti na změnových řízeních,
 - dozor při zpracování dokumentace dočasných zařízení staveniště a zásad organizace výstavby s vybraným Zhotovitelem stavby s ohledem na zpracovaný plán Zhotovitele a s ohledem na probíhající provoz v místě realizace Stavby,
 - účast také na dalších jednáních související s výběrem materiálů, výrobků, případně řešících změny Stavby vyvolaných Objednatelem nebo Zhotovitelem stavby,
 - účast při předání a převzetí Stavby jak ke zkouškám či zkušebnímu provozu, tak také k běžnému užívání, a to za účelem poskytování informací a vyjadřování stanovisek vztahujících se k výkonu autorského dozoru,
 - účast při reklamačních řízeních,
 - kontrola dokumentace skutečného provedení stavby zpracované Zhotovitelem stavby.
- e) služby či práce výslovně nespecifikované a potřebné k řádnému provedení díla, které vyplývají z povahy prováděného díla, a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět, nebo vyplývají z relevantních právních předpisů souvisejících s prováděním díla.

- 3.4. Projektová dokumentace pro provádění stavby (pro výběr zhotovitele stavby), včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, musí být zpracována v souladu se ZZVZ (zejm. § 36 odst. 1 ZZVZ - zákaz stanovení zadávacích podmínek tak, aby určitým dodavatelům bezdůvodně přímo nebo nepřímo zaručovaly konkurenční výhodu nebo vytvářely bezdůvodné překážky hospodářské soutěže a § 89 odst. 5 ZZVZ - zákaz stanovení technických podmínek tak, aby zvýhodňovaly nebo znevýhodňovaly určité dodavatele nebo výrobky, příp. § 89 odst. 6 ZZVZ a § 90 odst. 3 ZZVZ), a jeho prováděcími vyhláškami, zejména vyhláškou o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce.

- 3.5. Zhotovitel předá objednateli projektovou dokumentaci pro vydání povolení záměru ve 2 tištěných vyhotoveních (paré č. 1 a 2) a dále 1x v elektronické podobě (prostřednictvím datového úložiště, nebo na CD či jiném vhodném nosiči dat) ve formátech pdf a dwg, doc (docx), xls (xlsx). Zhotovitel předá objednateli projektovou dokumentaci pro provádění stavby v 6 tištěných vyhotoveních (paré č. 1 až 6) a 1 x v elektronické podobě (prostřednictvím datového úložiště, nebo na CD či jiném vhodném nosiči dat) ve formátech pdf a dwg, doc (docx), xls (xlsx). Zhotovitel předá objednateli oceněný položkový rozpočet, soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a to 1x v elektronické podobě (prostřednictvím datového úložiště, nebo na CD či jiném vhodném nosiči dat), a to ve formátech pdf, xls (xlsx) a xlm. Veškeré dokumenty dle tohoto odstavce budou členěny dle stavebních objektů, a to dle požadavků objednatele. Dokumentace musí být opatřena Elektronickým autorizačním razítkem a Elektronickým časovým razítkem, přičemž každý dokument (např. technická zpráva) a každý výkres musí být „orazítkován“ samostatně. Objednatel si vyhrazuje možnost požadovat v odůvodněných případech další výtisky projektových dokumentací.
- 3.6. Projektová dokumentace musí volit nejvhodnější a nejekonomičtější řešení stavby, včetně nákladů souvisejících s užíváním stavby a nákladů na její údržbu.
- 3.7. Zhotovitel je povinen provést předmět díla ve sjednaném rozsahu, bezvadně a včas, v souladu se zadáním a v souladu s platnými právními předpisy, právními normami a zejména dotačními podmínkami.
- 3.8. Zhotovitel se zavazuje při zpracování díla navrhopvat inovativní řešení, pokud je to možné a vhodné vzhledem k účelu stavby.
- 3.9. Provádění inženýrské činnosti zhotovitelem zahrnuje veškeré činnosti a práce nutné k zajištění pravomocného povolení záměru, či jiného potřebného opatření stavebního úřadu, zejména zajištění všech požadovaných závazných stanovisek dotčených orgánů, zajištění souhlasů a jiných bezrozporných stanovisek účastníků řízení a dále jednání se správními úřady k zahájení a vedení správních řízení, a to včetně úhrady nákladů s tím spojených (tzn. poštovné, kolkovné, dopravné, náklady spojené s tiskem paré nad rámec počtu stanoveného v odst. 3.5. této smlouvy, správní poplatky vyměřené a vybírané správními úřady apod.).
- 3.10. Součástí provedení díla jsou všechny relevantní činnosti stanovené platnými a účinnými právními předpisy a technickými normami a v jejich kontextu pokyny objednatele. Pokyny objednatele jsou oprávněny udělovat osoby zastupující objednatele ve věcech technických.
- 3.11. Součástí provedení díla je dále zajištění potřebných podkladů a průzkumů, a to zejména následujících:
- a) geodetické zaměření polohopisu a výškopisu řešeného území, pokud bude zapotřebí; zadavatel uvádí, že disponuje geodetickým zaměřením z listopadu roku 2022,
 - b) inženýrskogeologický průzkum a hydrogeologický průzkum v rozsahu nezbytném pro řádné zpracování projektové dokumentace,

- c) průzkum a posouzení stávajícího stavu inženýrských sítí (kamerové zkoušky apod.), zadavatel uvádí, že disponuje průzkumem inženýrských sítí z 12/2023,
 - d) prezentace projektové dokumentace, bude-li objednatelem požadována,
 - e) zpracování všech dalších potřebných průzkumů, zkoušek, diagnostiky, měření potřebných pro zpracování projektové dokumentace, zadavatel uvádí, že disponuje diagnostikou v místě okružních křižovatek III//2099, exit 142 z 04/2024,
 - f) vypracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (plán BOZP),
 - g) vypracování plánu organizace výstavby v rámci zpracování DPZ.
- 3.12. Pokud jsou k řádnému a včasnému splnění požadavků objednatele uvedených ve smlouvě potřebné i další kontrolní, poradenské, technické, administrativní anebo další služby ve smlouvě výslovně neuvedené, které jsou obvykle spojeny s provedením obdobného díla, je zhotovitel povinen tyto další služby na své náklady obstarat či provést bez dopadu na výši ceny.
- 3.13. Zhotovitel je dále povinen:
- a) účastnit se na základě písemné pozvánky Objednatele všech jednání týkajících se díla,
 - b) v průběhu zpracování díla projednávat s Objednatelem dílo na pravidelných kontrolních dnech, které se budou konat min. 1x za 14 kalendářních dní – není-li u jednotlivých částí díla stanovena jiná četnost kontrolních dnů (zpracování díla ukončí závěrečným projednáním s Objednatelem), v případě, že to bude situace vyžadovat, může Objednatel požadovat konání kontrolních dnů 1x za týden, z každého jednání Zhotovitel vyhotoví zápis,
 - c) poskytnout Objednateli požadovanou dokumentaci,
 - d) písemně informovat Objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to neprodleně, nejpozději však 3 pracovní dny poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo Zhotovitel zjistí, že by nastat mohla.
- 3.14. Pokud v průběhu provádění díla dojde ke skutečnostem, které nepředpokládala žádná ze smluvních stran a které mohou mít např. vliv na cenu, dobu plnění (viz čl. 3.13 písm. d) smlouvy), zavazují se Zhotovitel i Objednatel na tyto skutečnosti písemně upozornit druhou smluvní stranu, včetně písemného návrhu řešení tak, aby byl naplněn účel této smlouvy.
- 3.15. Objednatel se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne Zhotoviteli součinnost při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění. Tuto součinnost poskytne Zhotoviteli ve lhůtě a rozsahu dojednaném oběma stranami.
- 3.16. Zhotovitel Objednateli průběžně předkládá výsledky své práce v podobě rozpracovaných dokumentů vztahujících se k vytvoření díla ke konzultaci. Objednatel má právo k předloženým materiálům dávat své připomínky. Zhotovitel se zavazuje

vyjádřit se k Objednatelům předloženým materiálům nejpozději do 1 týdne od jejich předložení ve formátu.pdf.

- 3.17. Zhotovitel je povinen akceptovat všechny připomínky a návrhy Objednatelů v případě, že nejsou v rozporu s právními předpisy, závaznými technickými normami nebo stanovisky příslušných orgánů veřejné správy a byly uplatněny v souladu s odstavcem 15 tohoto článku.
- 3.18. Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla na základě požadavků objednatelů, uzavřou obě strany písemný dodatek ke smlouvě, ve kterém dohodnou úpravu ceny a termínů plnění předmětu této smlouvy, resp. předání díla.
- 3.19. Výchozím podkladem pro zpracování předmětu díla ve smyslu čl. 3. smlouvy je dokumentace pro územní rozhodnutí včetně průzkumů inženýrských sítí z 12/2023, dendrologického průzkumu z 12/2023, dopravního posouzení MÚK Těšovice z 12/2022, Báňského posudku 05/2021, diagnostiky vozovky v místě okružních křižovatek III//2099, exit 142 z 04/2024 a geodetického zaměření z 11/2019, která byla součástí zadávací dokumentace v zadávacím řízení. Zhotovitel se zavazuje provádět předmět díla v souladu s touto dokumentací pro územní rozhodnutí.

4. LICENCE K DÍLU

- 4.1. Zhotovitel poskytuje objednateli oprávnění k užití díla, je-li ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) (dále jen „autorský zákon“), autorským dílem (dále jen „licence“).
- 4.2. Licence k dílu, resp. částem díla, se poskytuje:
- a) jako úplatná, přičemž úplata je zahrnuta v ceně díla podle čl. 8. smlouvy;
 - b) jako výhradní;
 - c) z hlediska časového rozsahu na neomezenou dobu;
 - d) z hlediska územního rozsahu na území České republiky;
 - e) z hlediska věcného rozsahu (způsobu užití) tak, že opravňuje objednatel ke všem známým a možným způsobům užití, které povaha díla, resp. části díla, připouští, a které nejsou v rozporu s právními předpisy, zejména k takovým způsobům užití, jež jsou potřebná nebo nezbytná k tomu, aby bylo dílo, resp. části díla, možné užívat k účelu sjednanému smlouvou nebo účelu ze smlouvy vyplývajícímu.
- 4.3. Zhotovitel tímto jménem všech autorů díla, resp. částí díla:
- a) bezplatně uděluje objednateli oprávnění dílo, resp. částí díla, zveřejnit a jakýmkoliv způsobem měnit, tedy zejm. je, jakkoliv upravovat, dělit, rozšiřovat, spojovat s díly jinými, zařadit do díla souborného apod.;
 - b) zmocňuje objednatel, aby jménem všech autorů díla, resp. částí díla, uděloval třetím osobám oprávnění dílo zveřejnit a jakýmkoliv způsobem měnit, tedy zejm. je, jakkoliv upravovat, dělit, rozšiřovat, spojovat s díly jinými, zařadit do díla souborného apod.;

- c) uděluje objednateli oprávnění zmocnit jménem všech autorů díla, resp. částí díla, třetí osoby k udělení oprávnění jiným třetím osobám ke zveřejnění nebo jakékoliv změně díla, resp. částí díla, v rozsahu podle tohoto článku jménem všech autorů díla, resp. částí díla.
- 4.4. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn zmocnění a oprávnění dle předchozího odstavce a licenci ve shora uvedeném rozsahu objednateli poskytnout a udělit, a to jak k dílu jako celku, tak i k jeho jednotlivým částem. Objednatel oprávnění a zmocnění dle předchozího odstavce přijímá. Zhotovitel jménem všech autorů díla, resp. částí díla, s objednatelem sjednává, že autoři díla, resp. částí díla, jsou oprávnění odvolat zmocnění dle předchozího odstavce jen v případě, že by objednatel při výkonu zástupčího oprávnění postupoval v rozporu s dobrými mravy.
- 4.5. Objednatel není povinen licenci využívat.
- 4.6. Objednatel je oprávněn licenci poskytnout nebo postoupit třetí osobě, a to zcela nebo z části. Zhotovitel tímto dává objednateli souhlas k poskytnutí nebo postoupení licence a nepožaduje sdělení, zda a komu byla licence poskytnuta nebo postoupena.

5. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA A PLNĚNÍ DALŠÍCH ZÁVAZKŮ

- 5.1. Zhotovitel je uzavřením této smlouvy objednatelem písemně zmocněn ke všem právním jednáním nezbytným pro zajištění komplexní inženýrské činnosti, zejména pro vydání povolení záměru.
- 5.2. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo svědomitě, v dobré víře, řádně a včas, s nejvyšší možnou odbornou péčí a v souladu se zájmy a pokyny objednatele, platnými právními předpisy, pravidly bezpečnosti a platnými technickými normami (ČSN a EN) bez ohledu na to, zda jsou závazné či nikoli.
- 5.3. Zhotovitel je povinen obstarat veškerá oznámení, zaplatit veškeré daně, odvody a poplatky a obstarat veškerá povolení, licence a souhlasy vyžadované právními předpisy ve vztahu k provedení a dokončení předmětu smlouvy a odstranění vad, a zhotovitel odškodní objednatele v případě, že tak zhotovitel opomněl učinit.
- 5.4. Zhotovitel bude provádět dílo na základě pokynů objednatele. Zhotovitel je vždy povinen jednat v souladu s pokyny objednatele a nemá právo se od těchto pokynů odchýlit, ledaže obdrží předem písemný souhlas objednatele, kterým schválí, že zhotovitel bude jednat podle vlastního uvážení, pokud je takové odchýlení nutné v případě nouze, kdy je třeba chránit zájmy objednatele a obdržení předchozího písemného souhlasu objednatele nelze rozumně požadovat.
- 5.5. Pokud pokyny vydané objednatelem zhotoviteli budou nevhodné pro účely včasného a řádného provedení a dokončení předmětu smlouvy nebo budou v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými požadavky účastníků řízení, orgánů státní správy a dotčených organizací, je zhotovitel neprodleně po obdržení takového pokynu povinen na to písemně upozornit objednatele, jinak bude odpovědný za veškeré škody způsobené provedením takového pokynu. Jestliže i přes písemné upozornění zhotovitele o nevhodnosti takového pokynu bude objednatel v písemném pokynu trvat na jeho dodržení, bude povinností zhotovitele takový pokyn provést, nebude však odpovědný za škodu způsobenou provedením takového pokynu.

- 5.6. Zhotovitel se zavazuje, že bude při plnění smlouvy postupovat v koordinaci, spolupráci a nepřetržité každodenní komunikaci s objednatelem, jeho poradci a všemi dalšími osobami, které se podílejí na plnění předmětu smlouvy, a to v maximálním možném rozsahu, Zhotovitel bude průběžně objednateli předávat dokumenty, které při plnění smlouvy získá, pokud tyto bezprostředně souvisí s předmětem plnění, na výzvu objednatele mu poskytne také veškeré další informace, dokumenty a vysvětlení týkající se postupu při plnění smlouvy.
- 5.7. Bez zbytečného odkladu po dokončení příslušné části díla, nejpozději však do patnácti dnů po předání projektové dokumentace pro vydání povolení záměru a dokončení inženýrské činnosti a předání projektové dokumentace pro provádění stavby, zhotovitel shromáždí záznamy, vytvoří přehledný systém archivace, který umožní objednateli rychlou orientaci a předá objednateli veškeré dokumenty, listiny, korespondenci, výkresy, změny projektové dokumentace v příslušném stupni, programy a údaje (v tištěné a elektronické formě) týkající se přípravy a zpracování projektové dokumentace v příslušném stupni, a poskytování služeb inženýrské činnosti podle smlouvy, ledaže jsou potřebné pro další činnost zhotovitele podle smlouvy a objednatel jejich ponechání v rukou zhotovitele odsouhlasí.
- 5.8. Zároveň je zhotovitel povinen vrátit objednateli veškeré předměty a dokumenty, které od objednatele v souvislosti s příslušnou prací obdržel, a to ve stejné výše uvedené lhůtě.
- 5.9. Zhotovitel je oprávněn si sjednat na své vlastní náklady podzhotovitele pro účely plnění smlouvy za předpokladu, že v takovém případě bude zhotovitel odpovědný objednateli za jakoukoli takto prováděnou část svých povinností vyplývajících ze smlouvy, jako kdyby je plnil zhotovitel sám.
- 5.10. Je-li zhotovitel povinen dle této smlouvy vyhotovit jakýkoli doklad či dokument, nelze z jeho schválení objednatelem, dovozovat přenesení odpovědnosti za řádné a včasné provedení díla ze zhotovitele na objednatele, a to ani částečně.
- 5.11. Zhotovitel pro případ vad stavby výslovně přijímá, že je ve smyslu § 2630 odst. 1 občanského zákoníku vzhledem k jím provedeným službám zavázán společně a nerozdílně se zhotovitelem stavby a dalšími osobami, ledaže prokáže, že vadu nezpůsobilo vadné provedení díla.
- 5.12. Podpisem této smlouvy zhotovitel bezúplatně poskytuje objednateli nevypověditelné, výhradní, převoditelné a neomezené právo k vytváření kopií, užívání a zpřístupnění dalším osobám projektové dokumentace v příslušném stupni, nebo jakékoli její části a také jakýchkoli dokumentů, listin, náčrtů, návrhů, změn projektové dokumentace v příslušném stupni, programů a dat vytvořených nebo poskytnutých zhotovitelem na základě smlouvy, jež požívá nebo může požívat ochrany podle právních předpisů v oblasti ochrany duševního vlastnictví, včetně práva upravovat a měnit takováto díla, a to za účelem realizace, provozování, užívání, údržby, změn, úprav, oprav a demolice stavby nebo jejích jednotlivých částí. Toto právo uděluje zhotovitel na dobu neurčitou a bude opravňovat také jakoukoli osobu, která bude řádným vlastníkem nebo uživatelem příslušné části stavby.
- 5.13. Zhotovitel je povinen plnit řádně a včas své závazky vůči svým poddodavatelům vzniklé na základě smlouvy nebo v souvislosti s ní, zejména hradit svým

poddodavatelům řádně a včas veškeré své peněžité závazky vůči svým poddodavatelům.

- 5.14. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné a účinné právní a technické předpisy týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod.
- 5.15. Zhotovitel je povinen poskytnout součinnost objednateli a případnému poskytovateli dotace, ze které může být předmět plnění této smlouvy spolufinancován, a to za účelem přípravy žádosti o dotaci a plnění podmínek stanovených poskytovatelem dotace v souvislosti s povinnostmi zhotovitele dle smlouvy, zejména při zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (např. rozdělení soupisu na způsobilé a nezpůsobilé výdaje apod.).

6. REALIZAČNÍ TÝM, PODDODAVATELÉ

- 6.1. Služby budou poskytovány pouze prostřednictvím členů realizačního týmu.
- 6.2. Osobou na pozici Vedoucí projektant je [REDAKCE] č. autorizace: [REDAKCE] tel. [REDAKCE], e-mail: [REDAKCE]. Hlavním úkolem této osoby je koordinace poskytování služeb vůči objednateli a odpovědnost za řádné plnění smlouvy (zejména za projektové práce a soulad projektové dokumentace v příslušném stupni se smlouvou) jako celku.
- 6.3. Osobou na pozici Autorizovaný inženýr / technik je [REDAKCE], č. autorizace: [REDAKCE], tel. [REDAKCE], e-mail: [REDAKCE]. Hlavním úkolem této osoby je odpovědnost za řádné plnění smlouvy (zejména za projektové práce a soulad projektové dokumentace v příslušném stupni se smlouvou).
- 6.4. Změna v osobě člena realizačního týmu podléhá písemnému schválení objednatele. Objednatel je oprávněn odepřít souhlas jen ze závažných důvodů. Nová osoba člena realizačního týmu musí splňovat minimální kvalifikační požadavky kladené na pozici člena realizačního týmu v zadávacím řízení. Pokud se bude jednat o nahrazení člena realizačního týmu, jehož odbornost byla předmětem hodnocení v rámci zadávacího řízení, je zhotovitel povinen jej nahradit jiným členem realizačního týmu, který bude splňovat minimálně stejnou odbornost (tj. v rámci zadávacího řízení by obdržel minimálně stejný počet bodů jako člen realizačního týmu nahrazovaný). Zhotovitel je povinen objednateli současně při návrhu záměny člena realizačního týmu předložit doklady a srovnání znázorňující, že nový člen splňuje stanovené požadavky.
- 6.5. Zhotovitel je povinen provádět dílo osobně či prostřednictvím členů realizačního týmu.
- 6.6. Veškeré odborné práce musí vykonávat členové realizačního týmu mající příslušnou odbornou kvalifikaci.
- 6.7. Zhotovitel odpovídá za plnění závazků členy realizačního týmu, jako by je plnil sám. Jakékoli určení, pokyn, inspekce, prohlídka, testování, souhlas, schválení nebo podobné konání nebo opomenutí učiněné členem realizačního týmu bude mít stejné účinky jako by bylo učiněno zhotovitelem samým.

- 6.8. Zhotovitel je povinen vybavit členy realizačního týmu potřebnými pravomocemi k tomu, aby mohli zhotovitele zastupovat v souvislosti s prováděním díla, zejména aby byli oprávněni přijímat pokyny objednatele.
- 6.9. Podzhotovitelé jsou uvedeni v seznamu poddodavatelů, který byl součástí nabídky. Změna v seznamu poddodavatelů podléhá písemnému schválení objednatele. Objednatel je oprávněn odepřít souhlas jen ze závažných důvodů. Ke změně podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, může dojít jen ve výjimečných případech. Nový podzhotovitel (poddodavatel) musí splňovat minimálně ty kvalifikační požadavky kladené na zhotovitele v zadávacím řízení, které v rámci zadávacího řízení zhotovitel prokázal původním podzhotovitelem (poddodavatelem). Zhotovitel je povinen objednateli současně při návrhu záměny kvalifikačního podzhotovitele předložit doklady a srovnání znázorňující, že nový podzhotovitel splňuje stanovené požadavky
- 6.10. Má-li být část díla provedena prostřednictvím podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, musí se tento podzhotovitel (poddodavatel) podílet na provedení díla nejméně v tom rozsahu, v jakém jeho prostřednictvím zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci.

7. LHŮTA PLNĚNÍ

- 7.1. Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla na základě písemné výzvy Objednatele zaslané do datové schránky Zhotovitele. Za účelem řádného provedení díla bude zhotovitel provádět dílo v rozsahu stanoveném touto smlouvou dle svého odborného úsudku, nebo na výzvu objednatele. Vyžádá-li si to postup realizace záměru, je zhotovitel povinen provádět služby i v sobotu, neděli nebo ve svátek bez nároku na navýšení ceny.
- 7.2. Plnění podle čl. 3.3. písm. a) smlouvy o dílo, tj. plnění spočívající ve vyhotovení projektové dokumentace pro vydání povolení záměru včetně zajištění komplexní inženýrské činnosti (zajištění samotného povolení záměru), bude plněno následovně:

Zahájení	Do 3 kalendářních dnů od zaslání písemné výzvy Objednatelem do datové schránky Zhotovitele. Písemná výzva se má za doručenu uplynutím třetího (3.) kalendářního dne od jejího zaslání.
Předání návrhu projektové dokumentace pro povolení záměru Objednateli k připomínkám	Zhotovitel předá Objednateli návrh projektové dokumentace pro povolení záměru nejpozději do 12 kalendářních týdnů ode dne doručení písemné výzvy ze strany Objednatele k zahájení prací.

<p>Sdělení připomínek k návrhu projektové dokumentace pro povolení záměru Zhotoviteli</p>	<p>Objednatel sdělí své připomínky Zhotoviteli do 4 týdnů od obdržení návrhu projektové dokumentace pro povolení záměru, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak.</p>
<p>Zpracování připomínek Objednatele k návrhu projektové dokumentace pro povolení záměru</p>	<p>Zhotovitel vypořádá připomínky Objednatele k projektové dokumentaci pro povolení záměru nejpozději do 2 kalendářních týdnů ode dne předání připomínek Objednatele Zhotoviteli, popř. od sdělení Objednatele, že nemá k návrhu projektové dokumentace pro povolení záměru, popř. od marného uplynutí lhůty pro uplatnění připomínek Objednatele k projektové dokumentaci pro povolení záměru. Zhotovitel předá ve stejném termínu projektovou dokumentaci se zpracovanými připomínkami Objednatele všem relevantním dotčeným orgánům a třetím osobám k vyjádření.</p>
<p>Dokončení projektové dokumentace pro povolení záměru včetně projednání</p>	<p>Zhotovitel předá Objednateli projektovou dokumentaci pro povolení záměru ve finální podobě (tj. včetně vypořádaných připomínek Objednatele a všech dotčených orgánů a třetích osob) nejpozději do 6 kalendářních týdnů ode dne doručení projektové dokumentace k vyjádření relevantním dotčeným orgánům a třetím osobám za předpokladu, že se dotčené orgány a třetí osoby k projektové dokumentaci vyjádří nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne obdržení řádné a včasné žádosti o vyjádření (stanovisko); v případě, kdy se dotčený orgán, orgány či třetí osoby vyjádří k žádosti později, tedy ve lhůtě delší než 30 kalendářních dnů ode dne obdržení žádosti o vyjádření (stanovisko), lhůta pro „Dokončení projektové dokumentace pro povolení záměru včetně projednání“ se o tomu odpovídající počet dní prodlužuje. V případě, že doba pro vydání vyjádření (stanoviska) přesáhne 30 kalendářních dnů u více dotčených orgánů nebo osob, bude termín pro „Dokončení projektové dokumentace pro povolení záměru včetně projednání“ prodloužen jen jedenkrát, a to o dobu, která přesáhne 30 kalendářních dnů nejvíce.</p>
<p>Podání žádosti o povolení záměru</p>	<p>Zhotovitel doručí bezvadnou žádost příslušnému stavebnímu úřadu nejpozději do 1 kalendářního týdne od „Dokončení projektové dokumentace pro povolení záměru včetně projednání“, a to včetně vložení</p>

	dokumentace pro povolení záměru do evidence elektronických dokumentací.
Finalizace části díla dle čl. 3.3. písm. a) této smlouvy (projektová dokumentace pro povolení záměru)	<p>Zhotovitel předá Objednateli pravomocné povolení a ověřené vyhotovení dokumentace pro povolení záměru nejpozději do 35 kalendářních týdnů ode dne doručení písemné výzvy k zahájení prací. Případné požadavky stavebního úřadu na doplnění dokumentace musí Zhotovitel bez odkladu vypořádat. O stavu řízení a jeho případné změně (zahájení, přerušování, ukončení apod.) Zhotovitel informuje Objednatele nejpozději do 3 kalendářních dnů.</p> <p>V této lhůtě jsou započteny lhůty pro řízení o povolení záměru v délce trvání max. 60 dnů. Pokud řízení bude trvat déle z důvodů, které nebudou na straně Zhotovitele, prodlužuje se termín „Finalizace části díla dle čl. 3.3. písm. a) této smlouvy“ o počet dnů, o které řízení přesáhne dobu 60 dnů. Tento termín se dále též prodlužuje o počet dní, o něž došlo k prodloužení termínu pro „Dokončení dokumentace pro povolení záměru včetně projednání“ v souladu s druhou a příp. třetí větou příslušného odstavce výše.</p>

7.3. Zhotovitel je povinen v rámci činností uvedených v odst. 3.3. písm. a) smlouvy (provedení související komplexní inženýrské činnosti) zejména:

a) obstarat potřebná závazná stanoviska dotčených orgánů státní správy a dotčených organizací, stanoviska a vyjádření správců inženýrských sítí, a získat a zajistit veškerá další nezbytná povolení, souhlasy, vyjádření a jiné dokumenty nutné pro vydání povolení záměru, a to bez zbytečného odkladu po dokončení činností podle odst. 3.3. písm. a) smlouvy;

- o objednatel se však zavazuje zajistit veškeré úkony spočívající ve vypořádání majetkových vztahů k pozemkům ve vlastnictví třetích stran nezbytné pro realizaci infrastruktury;

b) upravit příslušnou dokumentaci podle podmínek a požadavků příslušného stavebního úřadu a dalších dotčených orgánů státní správy a samosprávy a v souladu s pokyny objednatel, a to bez zbytečného odkladu po dokončení činností podle odst. 3.3. písm. a) smlouvy;

c) připravit, zkompletovat a podat příslušný návrh na vydání povolení záměru, a to bez zbytečného odkladu po dokončení činností podle odst. 3.3. písm. a) smlouvy.

7.4. Plnění podle čl. 3.3. písm. b) smlouvy o dílo, tj. plnění spočívající ve vyhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby, bude plněno následovně:

Zahájení	Do 3 kalendářních dnů od zaslání písemné výzvy Objednatelem do datové schránky Zhotovitele.
-----------------	---

	Písemná výzva se má za doručenu uplynutím třetího (3.) kalendářního dne od jejího zaslání.
Předání návrhu projektové dokumentace pro provádění stavby Objednateli k připomínkám	Zhotovitel předá Objednateli návrh projektové dokumentace pro provádění stavby ve lhůtě, která bude stanovena jako 1,25násobek lhůty sjednané v čl. 7.2., oddíl Předání návrhu projektové dokumentace pro povolení záměru Objednateli k připomínkám. Lhůta počíná běžet ode dne doručení písemné výzvy ze strany Objednatele k zahájení prací.
Sdělení připomínek k návrhu projektové dokumentace pro provádění stavby Zhotoviteli	Objednatel sdělí své připomínky Zhotoviteli do 4 týdnů od obdržení návrhu projektové dokumentace pro provádění stavby, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak.
Finalizace části díla dle čl. 3.3. písm. b) této smlouvy – dokumentace pro provádění stavby	Zhotovitel vypořádá připomínky Objednatele k projektové dokumentaci pro provádění stavby a předá Objednateli upravenou projektovou dokumentaci nejpozději do 3 kalendářních týdnů ode dne předání připomínek Objednatele Zhotoviteli, popř. od sdělení Objednatele, že nemá k návrhu projektové dokumentace pro provádění stavby připomínky, popř. od marného uplynutí lhůty pro uplatnění připomínek Objednatele k projektové dokumentaci pro provádění stavby.

- 7.5. Plnění podle čl. 3.3. písm. c) smlouvy o dílo, tj. poskytnutí součinnosti při výběru Zhotovitele stavby, bude plněno následovně:

Zahájení	Do 3 kalendářních dnů od zaslání písemné výzvy Objednatelem do datové schránky Zhotovitele. Písemná výzva se má za doručenu uplynutím třetího (3.) kalendářního dne od jejího zaslání.
Ukončení části plnění dle čl. 3.3. písm. c) této smlouvy – součinnost při výběru Zhotovitele stavby	Ke dni rozhodnutí o výběru Zhotovitele stavby nebo ke dni, v němž Objednatel Zhotoviteli oznámí, že příslušné zadávací řízení zrušil a další zadávací řízení na Zhotovitele stavby již nebude vyhlašovat.

- 7.6. Plnění podle čl. 3.3. písm. d) smlouvy o dílo, tj. výkon autorského dozoru, bude plněno následovně:

Zahájení	Do 3 kalendářních dnů od zaslání oznámení Objednatele o zahájení Stavby do datové schránky Zhotovitele. Oznámení se má za doručené
-----------------	--

	uplynutím třetího (3.) kalendářního dne od jeho zaslání.
Průběžně	Na základě písemných výzev Objednatele zaslaných minimálně 24 hodin předem na emailovou adresu Vedoucího projektanta uvedenou v čl. 6.2. této smlouvy. Do této lhůty se nezapočítávají víkendy a státní svátky.
Ukončení	Ke dni vydání kolaudačního souhlasu, resp. po odstranění všech vad a nedodělků z přejímacího a kolaudačního řízení.

Předpokládaný rozsah výkonu činnosti autorského dozoru: 500 hodin.

Zhotovitel v rámci výkonu činnosti autorského dozoru vždy nejpozději do 10 (deseti) dnů od skončení každého kalendářního měsíce, v němž bude Stavba realizována, zašle Objednateli e-mailem na adresu [REDAKCE], a/nebo předloží Objednateli ve 2 (dvou) vyhotoveních v listinné podobě písemnou zprávu o výkonu autorského dozoru, která bude obsahovat přehled činností realizovaných Zhotovitelem v daném měsíci v rámci autorského dozoru spolu s jejich podrobným popisem a zhodnocením. Objednatel je povinen vyjádřit se k předložené zprávě do 5 dnů ode dne jejího obdržení. Nebude-li mít ke zprávě žádné výhrady, potvrdí svůj souhlas s jejím obsahem zasláním potvrzujícího e-mailu na adresu [REDAKCE], nebo (v případě předložení zprávy v listinné podobě) jejím podpisem na jednom z vyhotovení, které neprodleně poté vydá zpět Zhotoviteli.

V případě přerušení stavby, bude též přerušen i autorský dozor. Dle orientačního harmonogramu projektu je realizace stavby (čistá výstavba) předpokládaná v období 4/2026–10/2027.

- 7.7. Objednatel souhlasí s převzetím díla i před dohodnutými termíny plnění.
- 7.8. Zhotovitel je povinen před uzavřením smlouvy předložit objednateli harmonogram prací, který bude zahrnovat činnosti uvedené v odst. 3.3. smlouvy.
- 7.9. Dílo nebo jeho část se považují za dokončené jejich předáním a převzetím bez vad a nedodělků, o čemž se sepíše písemný protokol, který podepíší objednatel a zhotovitel. Tento protokol, v němž objednatel výslovně prohlásí, že dílo nebo jeho část přejímá, je rozhodující skutečností pro splnění termínu dokončení díla či jeho částí.
- 7.10. Zjistí-li zhotovitel v průběhu poskytování předmětu plnění, že předmět plnění nelze poskytovat nebo že nelze dodržet termíny plnění stanovené smlouvou, je povinen vždy na to objednatele neprodleně upozornit. Tím nejsou dotčeny další povinnosti zhotovitele, zejména povinnost zaplatit smluvní pokutu za prodlení s poskytováním předmětu plnění a odpovědnost zhotovitele za škodu.
- 7.11. Termíny dokončení díla stanovené v tomto článku smlouvy o dílo mohou být prodlouženy z důvodu přerušení nebo zastavení projektových prací vyvolaných objednatелеm. V tomto případě se prodlužují termíny o dobu prodlení objednatелеm.

- 7.12. Zhotovitel neodpovídá za prodlení s plněním těch částí díla, jejichž ukončení je závislé výhradně na orgánech veřejné moci, jestliže toto prodlení nezavinil a nemohl předpokládat. Takovým prodlením je zejména prodlení způsobené překročením zákonné lhůty pro vydání rozhodnutí stavebního úřadu, nebylo-li zaviněno Zhotovitelem. O dobu, po kterou je správní orgán v prodlení, se prodlužují příslušné dílčí doby plnění, přičemž k této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, případně podmínky poskytnutí dotace nestanoví jinak.
- 7.13. Místem plnění pro předání jednotlivých částí díla je sídlo zadavatele. Místem plnění navrhované stavby je katastrální území Sokolov, Vítkov u Sokolova a Staré Sedlo u Sokolova.

8. CENA DÍLA

- 8.1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a činí:
- a) cena za činnosti uvedené v odst. 3.3. písm. a) smlouvy (zpracování projektové dokumentace pro povolení záměru vč. zajištění komplexní inženýrské činnosti) 1 740 000 Kč bez DPH, sazba DPH 21 %, výše DPH 365 400 Kč, 2 105 400 Kč včetně DPH,
 - b) cena za činnosti uvedené v odst. 3.3. písm. b) smlouvy (zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby) 1 160 000 Kč bez DPH, sazba DPH 21 %, výše DPH 243 600 Kč, 1 403 600 Kč včetně DPH,
 - c) cena za činnosti uvedené v odst. 3.3. písm. d) smlouvy (výkon autorského dozoru – hodinová sazba) 1 200 Kč bez DPH/hod, sazba DPH 21 %, výše DPH 252 Kč/hod, 1 452 Kč včetně DPH/hod,
- 8.2. Cena za činnosti uvedené v odst. 3.3. písm. c) smlouvy je zahrnuta v ceně dle odst. 8.1. písm. a) smlouvy.
- 8.3. Cena za činnosti uvedené v odst. 3.3. písm. e) smlouvy je zahrnuta v ceně dle odst. 8.1. písm. a) a b) smlouvy.
- 8.4. V případě, že dojde v průběhu výkonu činnosti autorského dozoru k přerušení stavby (např. nevhodné klimatické podmínky, nevhodné pokyny Objednatele Zhotoviteli stavby apod.) a v důsledku toho též k přerušení výkonu činnosti autorského dozoru na základě písemné výzvy (pokynu) Objednatele, nevzniká Zhotoviteli po dobu přerušení výkonu činností autorského dozoru nárok na odměnu. Zhotovitel je povinen autorský dozor provádět až do vydání kolaudačních souhlasů, respektive do odstranění všech vad a nedodělků z přejímacího a kolaudačního řízení.
- 8.5. Cena bez DPH je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou dobu platnosti smlouvy. Dojde-li v průběhu realizace stavby ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, bude v takovém případě k ceně díla bez DPH připočtena DPH v aktuální sazbě platné v době vzniku zdanitelného plnění.
- 8.6. Zhotovitel prohlašuje, že cena zahrnuje veškeré náklady, které bude třeba nutně nebo účelně vynaložit zejména pro řádnou a včasnou realizaci díla, jakož i pro řádné a včasné splnění závazků souvisejících při zohlednění veškerých rizik a vlivů,

o kterých lze v průběhu realizace díla či souvisejících závazků uvažovat, jakož i přiměřený zisk zhotovitele. Zhotovitel dále prohlašuje, že cena je stanovena i s přihlédnutím k vývoji cen v příslušném oboru včetně vývoje kurzu české měny k zahraničním měnám, a to po celou dobu trvání závazků ze smlouvy.

- 8.7. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku a v této souvislosti dále prohlašuje, že:
- a) je plně seznámen s rozsahem a povahou díla,
 - b) správně vymežil, vyhodnotil a ocenil veškeré činnosti, které jsou nezbytné pro řádné a včasné splnění závazků dle této smlouvy,
 - c) řádně prověřil místní podmínky pro provedení díla.
- 8.8. Zhotovitel není oprávněn od třetích osob v souvislosti s provedením díla nebo s realizací záměru přijímat platby, jiná plnění či čerpat jakékoli výhody. Porušení tohoto odstavce ze strany zhotovitele se považuje za podstatné porušení smlouvy.

9. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 9.1. Úhrada ceny díla bude objednatelům prováděna na základě daňových dokladů.
- 9.2. Cena bude zhotoviteli uhrazena po částech, které odpovídají jednotlivým činnostem.
- 9.3. Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu uvedenou v odst. 8.1. písm. a) smlouvy následovně:
- 15 % z ceny části díla po předání projektové dokumentace pro povolení záměru k připomínkám,
 - 35 % z ceny části díla po předání projektové dokumentace pro povolení záměru se zapracovanými připomínkami Objednatele,
 - 15 % z ceny části díla po předání žádosti o povolení záměru společně s dokladem o podání na příslušný stavební úřad,
 - 35 % z ceny části díla po předání pravomocného povolení záměru.
- 9.4. Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu uvedenou v odst. 8.1. písm. b) smlouvy následovně:
- 15 % z ceny části díla po 10 kalendářních týdnech od zahájení prací,
 - 35 % z ceny části díla po předání projektové dokumentace pro provádění stavby k připomínkám,
 - 40 % z ceny části díla po předání projektové dokumentace pro provádění stavby se zapracovanými připomínkami Objednatele,
 - 10 % z ceny části díla po výběru Zhotovitele stavby nebo po oznámi Objednatele, že příslušné zadávací řízení zrušil a další zadávací řízení na Zhotovitele stavby již nebude vyhlašovat.
- 9.5. Zhotovitel je oprávněn vyfakturovat cenu uvedenou v odst. 8.1. písm. c) smlouvy následovně:

- a) průběžně na konci každého kalendářního měsíce, počínaje kalendářním měsícem, v němž dojde k zahájení výkonu činnosti autorského dozoru na základě písemné výzvy Objednatele a konče kalendářním měsícem, v němž dojde k vydání kolaudačního souhlasu, resp. k odstranění vad a nedodělků z přejímacího a kolaudačního řízení. Fakturován bude skutečný počet hodin násobený hodinovou sazbou uvedenou v čl. 8.1. písm. c) této smlouvy. Přílohou faktury bude kopie Objednatelem schválené písemné zprávy dle čl. 7.6. této smlouvy a dále Objednatelem odsouhlasený soupis počtu hodin skutečně provedeného výkonu autorského dozoru.
- 9.6. Daňový doklad bude zaslán objednateli v elektronické podobě e-mailem na e-mailovou adresu: [REDACTED]. Splatnost faktury je 60 kalendářních dnů ode dne doručení objednateli.
- 9.7. Fakturace části díla dle čl. 3.3. písm. a) a b) této smlouvy bude prováděna na základě splnění milníků stanovených v čl. 9.3. a 9.4. této smlouvy.
- 9.8. Daňové doklady musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle příslušných právních předpisů a náležitosti uvedené ve smlouvě, případně i další náležitosti, jejichž požadavek objednatel písemně sdělí zhotoviteli po podpisu smlouvy. V případě, že daňové doklady nebudou obsahovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn je vrátit zpět k doplnění, lhůta splatnosti počne běžet znovu od doručení řádně opraveného daňového dokladu.
- 9.9. V případě, že faktura nebude obsahovat předepsané náležitosti a tuto skutečnost zjistí až příslušný správce daně či jiný orgán oprávněný k výkonu kontroly u zhotovitele nebo objednatele nese veškeré následky z tohoto plynoucí zhotovitel.
- 9.10. Daňový doklad je uhrazen dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Platba bude provedena na účet zhotovitele uvedený ve smlouvě, není-li dále stanoveno, jinak, nebo pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 9.11. Vyplývá-li z informací zveřejněných správcem daně ve smyslu ZoDPH, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem DPH, je objednatel oprávněn příslušnou DPH uhradit přímo místně a věcně příslušnému správci daně zhotovitele. Tento odstavec se užije pouze v případě, že dílo nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti v souladu s § 92a a § 92e ZoDPH.
- 9.12. Bude-li faktura obsahovat číslo bankovního účtu určeného k úhradě ceny díla nebo její části a případné DPH, které není správcem daně ve smyslu ZoDPH zveřejněno jako číslo bankovního účtu, které je zhotovitelem používáno pro ekonomickou činnost, je objednatel oprávněn uhradit cenu díla nebo její část, na něž byla vystavena faktura, a případnou DPH na bankovní účet zveřejněný správcem daně ve smyslu ZoDPH jako bankovní účet, který je zhotovitelem používán pro ekonomickou činnost. Ve vztahu k objednatelům případně hrazené DPH se tento odstavec užije pouze v případě, že dílo nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti v souladu s § 92a a § 92e ZoDPH.

10. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

- 10.1. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do okamžiku předání a převzetí díla.
- 10.2. Zhotovitel odpovídá za škody, které vzniknou z jeho činnosti v souvislosti s prováděním díla. Zhotovitel je za škodu odpovědný i v případě, pokud ji způsobí jakákoli třetí osoba, prostřednictvím které zhotovitel plnil závazky vyplývající ze smlouvy.
- 10.3. Zhotovitel odpovídá za škodu, která Objednateli vznikne v důsledku vadně provedeného díla, a to v plném rozsahu. Zhotovitel dále odpovídá za veškerou škodu, která vznikne Objednateli nebo třetím osobám v důsledku porušení povinnosti Zhotovitele jednat s řádnou odbornou péčí nebo povinnosti stanovené právními či jinými relevantními předpisy. Smluvní strany výslovně sjednávají, že za škodou na straně Objednatele může být považována i vada stavebního díla, které bude zhotovováno na základě Zhotovitelem vypracované projektové dokumentace pro provádění stavby, pokud takové vady budou vyplývat z postupů určených projektovou dokumentací pro provádění stavby.
- 10.4. Smluvní strany dále výslovně sjednávají, že za škodou na straně Objednatele může být považováno neposkytnutí dotace z veřejných prostředků nebo poskytnutí dotace v nižší výši, než by mohla být dotace poskytnutá v případě, kdy by Zhotovitel splnil své povinnosti řádně. V případě, že v důsledku porušení povinností Zhotovitele bude Objednatel povinen vrátit dotaci nebo její část, považuje se za způsobenou škodu jak částka vrácené dotace, tak i související sankční plnění Objednatele.
- 10.5. Zhotovitel se zavazuje nahradit Objednateli veškerou škodu vzniklou na základě řádně uplatněných nároků třetích osob vzniklých v důsledku porušení jakékoliv povinnosti Zhotovitele, a to včetně nároků vyplývajících z uplatnění práv třetích osob k duševnímu či průmyslovému vlastnictví, které bylo součástí plnění Zhotovitele. Zhotovitel se zároveň zavazuje v případě, že porušení práv třetích osob je trvalého charakteru, zajistit bez zbytečného odkladu a na vlastní náklady, aby dílo nebo část díla nadále práva třetích osob neporušovalo.
- 10.6. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.

11. POJIŠTĚNÍ

- 11.1. Zhotovitel předložil objednateli před podpisem smlouvy doklad prokazující, že má uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu své podnikatelské činnosti kryjící případné škody způsobené při provedení díla objednateli či třetím osobám ve výši minimálně 30 000 000 Kč na každý škodní případ po celou dobu provádění díla. Zhotovitel se zavazuje pojištění dle tohoto odstavce udržovat v platnosti po celou dobu provádění díla. Nesplnění povinností zhotovitele dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení smlouvy.

12. SANKCE

- 12.1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům řádné odborné péče, požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla nebo pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.
- 12.2. Zhotovitel prohlašuje, že v případě, kdy v mezidobí mezi předáním projektové dokumentace pro provedení stavby Objednatele a realizací díla podle takové projektové dokumentace, nikoli však v době delší než 5 let, dojde ke změně relevantních předpisů vyžadující změnu projektové dokumentace, takovou změnu projektové dokumentace na svůj náklad pro Objednatele provede.
- 12.3. Součinnost Objednatele, zejména informování Zhotovitele bez zbytečného odkladu o důležitých skutečnostech souvisejících se sjednaným předmětem plnění, se považuje za opatření potřebné k odvrácení nebo zmírnění škody, která může vzniknout v důsledku vad díla.
- 12.4. Projeví-li se na provedeném díle vada, Objednatel písemně oznámí Zhotoviteli takovou vadu a vadu popíše. Jakmile Objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, neuvede-li v oznámení jinak.
- 12.5. Zhotovitel je povinen odstranit vadu díla nejpozději do 10 pracovních dnů od jejího oznámení Objednatelem, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou písemně jinak. Při zjištěných vadách v průběhu zadávacího řízení na výběr dodavatele stavby je povinen Zhotovitel řešit vady okamžitě tak, aby mohl Objednatel jakožto zadavatel splnit své povinnosti dle ZZVZ.
- 12.6. Provedenou opravu vady díla Zhotovitel Objednateli předá písemným protokolem.
- 12.7. Zhotovitel odpovídá za všechny vady díla (včetně právních), zejména však:
 - za vady samotného projektu stavby
 - za vady stavebního díla způsobené vadami projektu stavby.
- 12.8. Nepředá-li Zhotovitel kteroukoliv část díla ve lhůtách dle čl. 7 této smlouvy, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši ve výši 5 000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení. V případě, kdy Zhotovitel bude v prodlení s předáním kterékoliv části díla o více než deset (10) pracovních dnů, je povinen uhradit Objednateli spolu s touto smluvní pokutou dále jednorázovou smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč.
- 12.9. V případě prodlení Objednatele s úhradou platby ceny nebo její části podle této smlouvy je Zhotovitel oprávněn účtovat Objednateli úrok z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku, veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence svěřenských fondů a evidence údajů o skutečných majitelích.

- 12.10. Pokud Zhotovitel neodstraní vadu díla ve lhůtě uvedené v čl. 12.5. této smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve vztahu ke každé takové vadě ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 12.11. V případě porušení povinnosti sjednané v čl. 3.13. písm. d) této smlouvy, dojde-li porušením této povinnosti k prodlení s plněním díla, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 15.000,- Kč za každý zjištěný případ.
- 12.12. V případě, že Zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. 6.4. této smlouvy (změní člena realizačního týmu uvedeného v nabídce, kterým Zhotovitel prokazoval splnění části kvalifikace, a to bez písemného souhlasu Objednatele), je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč za každý zjištěný případ.
- 12.13. V případě, že Zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. 6.9. této smlouvy (změní poddodavatele uvedeného v nabídce, kterým Zhotovitel prokazoval splnění části kvalifikace, a to bez písemného souhlasu Objednatele), je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč za každý zjištěný případ.
- 12.14. Dojde-li kdykoliv do kolaudace Stavby ke zjištění nesouladu mezi výkazem výměr a projektovou dokumentací a zároveň v důsledku tohoto nesouladu dojde k navýšení celkové ceny stavby o více než 5 % (vícenáklady), je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 25 % z celkové ceny za části díla dle čl. 8.1. písm. a) a b) této smlouvy včetně DPH (projektová dokumentace pro povolení záměru a projektová dokumentace pro provádění stavby).
- 12.15. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s předložením jakékoli pojistné smlouvy nebo jiného dokladu o pojištění předkládané podle smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH (ke dni uzavření smlouvy) za každý i jen započatý den prodlení.
- 12.16. Smluvní pokuty se stávají splatnými 30. dnem následujícím po dni, ve kterém na ně vznikl nárok.
- 12.17. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatel na náhradu škody způsobené mu porušením povinností zhotovitele, ke které se vztahuje smluvní pokuta. To platí i tehdy, bude-li smluvní pokuta snížena rozhodnutím soudu.
- 12.18. Pokud závazek splnit předmět smlouvy zanikne před řádnou dobou plnění, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením smluvní povinnosti.
- 12.19. Uhrazením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na úhradu způsobené újmy v plné výši.

13. UKONČENÍ SMLOUVY

- 13.1. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení povinností objednatel.
- 13.2. Za podstatné porušení smlouvy podle § 2002 a násl. občanského zákoníku, při kterém je druhá strana oprávněna odstoupit od smlouvy, se považuje zejména:

- a) v případě, byť nepodstatného porušení povinností zhotovitele, bez zbytečného odkladu poté, co z chování zhotovitele nepochybně vyplyne, že poruší smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu objednatele přiměřenou jistotu,
 - b) v případě, že zhotovitel bude zapojen do jednání, které objednatel důvodně považuje za škodlivé pro zájmy a dobré jméno objednatele nebo záměru;
 - c) prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením díla o více než 30 dnů,
 - d) úpadek zhotovitele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů,
 - e) vstup zhotovitele do likvidace,
 - f) v případě, že zhotovitel v nabídce podané v zadávacím řízení uvedl informace nebo předložil doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek tohoto zadávacího řízení.
- 13.3. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že Objednatel bude v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy po dobu delší než šedesát (60) kalendářních dní.
- 13.4. Smluvní strany sjednávají, že za podstatné porušení smlouvy se mimo výslovně uvedených případů považuje rovněž takové porušení povinnosti smluvní strany, o němž již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá smluvní strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvíдалa.
- 13.5. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. Odstoupení od smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně.
- 13.6. Smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran.
- 13.7. Smluvní strany se dohodly, že závazky vzniklé z této smlouvy mohou zaniknout výpovědí, a to za níže uvedených podmínek.
- a) Objednatel je oprávněn závazky kdykoli částečně nebo v celém rozsahu vypovědět. Závazky pak zanikají doručením výpovědi, není-li ve výpovědi uvedeno jinak.
 - b) Zhotovitel je oprávněn závazky částečně nebo v celém rozsahu vypovědět v případě podstatného porušení smlouvy objednatelem.
 - c) Smluvní strany pro případ výpovědi ze strany zhotovitele sjednávají 3měsíční výpovědní dobu, která počíná běžet od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď objednateli doručena.
 - d) Výpověď musí mít písemnou formu.

14. DŮVĚRNÉ INFORMACE A ZÁKAZ KONKURENCE

- 14.1. Pro účely této smlouvy se za důvěrné informace považují následující:
- a) informace označené objednatelem za důvěrné,

- b) informace podstatného a rozhodujícího charakteru o stavu provedení díla či stavu provedení stavby,
 - c) informace o finančních závazcích vzniklých v souvislosti s provedením díla či provedením stavby,
 - d) informace o sporech mezi objednatelem a jeho smluvními partnery v souvislosti s provedením díla či provedením stavby,
 - e) informace právními předpisy označené jako důvěrné či právními předpisy označené jako nezveřejnitelné bez splnění předchozích podmínek.
- 14.2. Za důvěrné informace nebudou považovány informace, které jsou přístupné veřejně nebo známé v době jejich užití nebo zpřístupnění třetím osobám, pokud taková přístupnost nebo známost nenastala v důsledku porušení zákonem uložené nebo smluvní povinnosti zhotovitele.
- 14.3. Zhotovitel se zavazuje, že bez předchozího souhlasu objednatele neužije důvěrné informace pro jiné účely než pro účely provádění díla a splnění povinností podle této smlouvy a nezveřejní ani jinak neposkytne důvěrné informace žádné třetí osobě, vyjma svých zaměstnanců, členů svých orgánů, poradců, právních zástupců a poddodavatelů. Těmto osobám však může být důvěrná informace poskytnuta pouze za té podmínky, že budou zavázáni udržovat takové informace v tajnosti, jako by byly stranami této smlouvy. Pokud bude jakýkoli správní orgán, soud či jiný státní orgán vyžadovat poskytnutí jakékoli důvěrné informace, oznámí zhotovitel tuto skutečnost neprodleně písemně objednateli.
- 14.4. V případě poskytnutí důvěrné informace je zhotovitel povinen vyvinout maximální úsilí k tomu, aby zajistil, že s nimi bude stále zacházeno jako s informacemi tvořícími obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku.
- a) V případě, že se zhotovitel dozví nebo bude mít důvodné podezření, že došlo ke zpřístupnění důvěrných informací nebo jejich části neoprávněné osobě nebo že došlo k jejich zneužití, je povinen o tom neprodleně písemně informovat objednatele

15. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 15.1. Veškerá jednání budou probíhat v českém jazyce. Veškeré písemnosti budou vyhotoveny v českém jazyce.
- 15.2. Smlouvu lze měnit pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.
- 15.3. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy třetí osobě.
- 15.4. Smlouva se řídí českým právním řádem. Obě strany se dohodly, že pro neupravené vztahy plynoucí ze smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.
- 15.5. Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešeny dohodou. V případě, že nedojde k dohodě stran, bude spor řešen místně a věcně příslušným soudem.


- 15.6. Zhotovitel je na základě § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je v tomto případě povinen vykonat veškerou součinnost s kontrolou.
- 15.7. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 15.8. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění smlouvy se smluvní strany dohodly, že smlouvu v registru smluv uveřejní objednatel.
- 15.9. Zhotovitel bere na vědomí, že snahou objednatele bude získat na realizaci stavebních prací podle projektové dokumentace dle této smlouvy dotaci či jinou formu finanční pomoci.
- 15.10. V případě, že objednatel získá na realizaci stavebních prací podle projektové dokumentace dle této smlouvy dotaci či jinou formu finanční pomoci, je zhotovitel povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů podle platných právních předpisů, minimálně však po dobu stanovenou poskytovatelem dotace. Zhotovitel je povinen minimálně po dobu stanovenou poskytovatelem dotace poskytovat požadované informace, vysvětlení a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (zejm. CRR, SFPI, SFŽP ČR, MŽP ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
- 15.11. Smlouva je vyhotovena v elektronickém originále a podepsána uznávanými elektronickými podpisy.
- 15.12. Přílohy smlouvy:
- Příloha č. 1 Koordinační situace
 - Příloha č. 2 Seznam poddodavatelů

V _____ dne __. __. 20__

 Digitálně podepsal


Datum: 2024.12.04
12:10:36 +01'00'

Za společnost Sokolovská uhelná, právní
nástupce, a.s.


předseda představenstva
objednatel


V _____ dne __. __. 20__





Datum: 2024.12.02 07:53:34 +01'00'

Za společnost SUDOP PRAHA a.s.


předseda představenstva
zhotovitel

V _____ dne __. __. 20__

 Digitálně podepsal Ing.


Datum: 2024.12.04
12:14:36 +01'00'

Za společnost Sokolovská uhelná, právní
nástupce, a.s.



člen představenstva
objednatel

V _____ dne __. __. 20__



Datum: 2024.12.02 07:34:23 +01'00'

Za společnost SUDOP PRAHA a.s.



místopředseda představenstva
zhotovitel

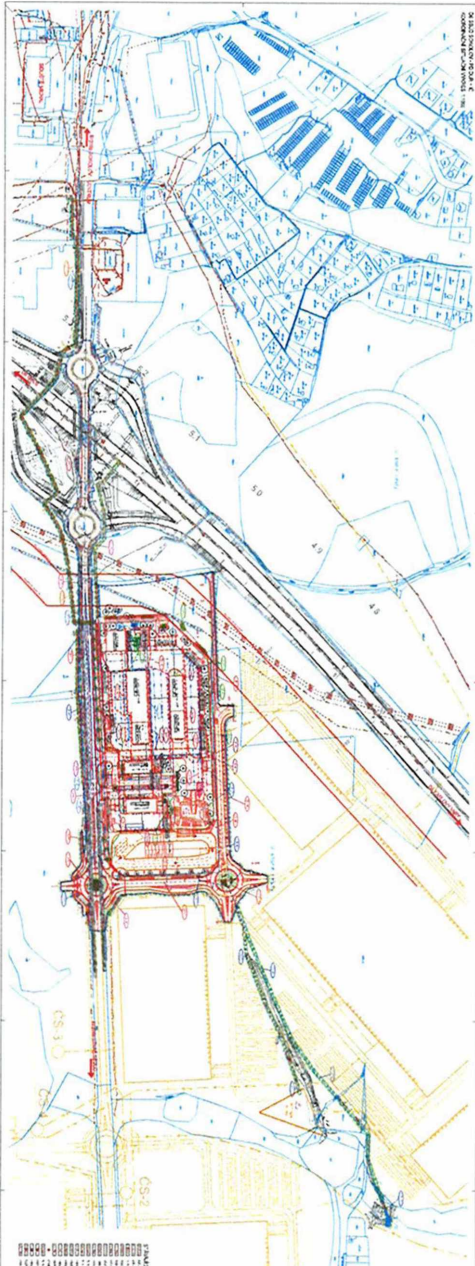
V _____ dne __. __. 20__

 Digitálně podepsal 
 il

Datum: 2024.12.04
20:23:32 +01'00'

Za společnost Ředitelství silnic a dálnic s. p.


ředitel Správy Karlovy Vary
objednatel








1. Станция
 2. Платформа
 3. Водосток
 4. Канализация
 5. Газопровод
 6. Электрический провод
 7. Дорога
 8. Зеленая зона
 9. Жилые здания
 10. Промышленные здания
 11. Парк
 12. Спортплощадка
 13. Детский сад
 14. Школа
 15. Больница
 16. Администрация
 17. Магазины
 18. Рестораны
 19. Кафе
 20. Бары
 21. Клубы
 22. Театры
 23. Концертные залы
 24. Библиотеки
 25. Музеи
 26. Парки культуры и отдыха
 27. Спортивные сооружения
 28. Объекты здравоохранения
 29. Объекты образования
 30. Объекты культуры и искусства
 31. Объекты социальной сферы
 32. Объекты промышленности и строительства
 33. Объекты транспорта
 34. Объекты связи
 35. Объекты энергетики
 36. Объекты водоснабжения
 37. Объекты водоотведения
 38. Объекты охраны окружающей среды
 39. Объекты безопасности
 40. Объекты обороны

Символ	Объект
1	Станция
2	Платформа
3	Водосток
4	Канализация
5	Газопровод
6	Электрический провод
7	Дорога
8	Зеленая зона
9	Жилые здания
10	Промышленные здания
11	Парк
12	Спортплощадка
13	Детский сад
14	Школа
15	Больница
16	Администрация
17	Магазины
18	Рестораны
19	Кафе
20	Бары
21	Клубы
22	Театры
23	Концертные залы
24	Библиотеки
25	Музеи
26	Парки культуры и отдыха
27	Спортивные сооружения
28	Объекты здравоохранения
29	Объекты образования
30	Объекты культуры и искусства
31	Объекты социальной сферы
32	Объекты промышленности и строительства
33	Объекты транспорта
34	Объекты связи
35	Объекты энергетики
36	Объекты водоснабжения
37	Объекты водоотведения
38	Объекты охраны окружающей среды
39	Объекты безопасности
40	Объекты обороны

1. PODDODAVATELÉ

- 1.1. Účastník čestně prohlašuje, že na plnění veřejné zakázky se budou podílet následující poddodavatelé:

Poddodavatel č. 1

Předmět poddodávky:	zpracování, technická pomoc v rozsahu silniční řešení, vodohospodářské a sdělovací objekty
Objem poddodávky v % (v Kč):	8 %
Název poddodavatele:	Sweco a.s.
Sídlo poddodavatele:	Praha 4, Tábořská 31, PSČ 14016
IČO poddodavatele:	26475081
Zastoupení poddodavatele:	 předseda představenstva  místopředseda představenstva  člen představenstva
Telefon poddodavatele:	
E-mail poddodavatele:	
Webová adresa poddodavatele:	
